



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Găgăuzia


Coordonat:
Denis LUNGUL
Secretar de Stat

Lungul DV
„16” martie 2026

Aprobat prin Decizia
CRD UTA Găgăuzia
nr. 1/1 din 17.03.2026

RAPORT DE PROGRES

privind implementarea POR UTA Găgăuzia 2022-2024
Perioada de raportare
ianuarie – decembrie 2025

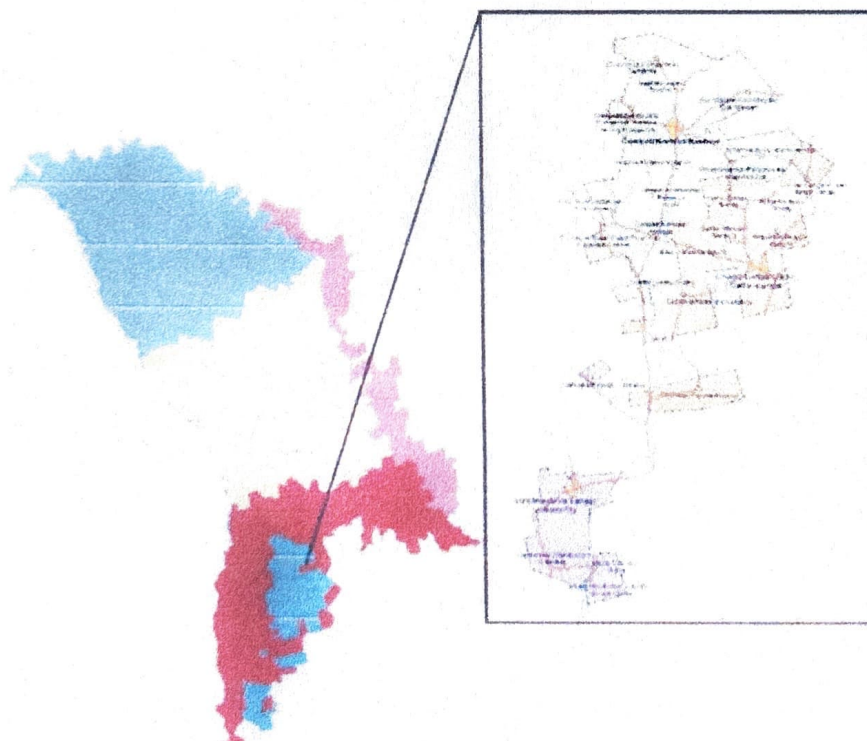

Comrat, 2026

Cuprins:

Cuprins:	2
Lista abrevierilor:	3
Sumar executiv	4
Introducere	9
Principalele rezultate atinse în perioada de raportare în procesul de implementare a POR	10
Obiectivul general: Creșterea competitivității și dezvoltări durabile a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor.	10
Obiectivul Specific 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia.	10
Măsura 1.1: Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii UTA Găgăuzia.	11
Măsura 1.2: Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.	18
Măsura 1.3 Identificarea și promovarea priorităților de specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	21
Măsura 1.4: Sprijin pentru cooperarea regională și transfrontalieră.	22
Obiectivul Specific 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială.	23
Măsura 2.1: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia.	24
Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri în regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia.	27
Obiectivul Specific 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de Dezvoltare Regională	29
Măsura 3.1: Sporirea eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională	29
Măsura 3.2: Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională.	36
Cooperarea cu partenerii de dezvoltare	38
Provocări și riscuri	43
Bune practici și lecții învățate	44
Concluzii	45

Lista abrevierilor:

AAC	– Aprovizionare cu apă și canalizare
ADR	– Agenția de Dezvoltare Regională
AID	– Asociația Internațională de Dezvoltare
APL	– Administrația Publică Locală
BNS	– Biroul Național de Statistică
CNCDR	– Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale
CRD	– Consiliul Regional pentru Dezvoltare
DUP	– Documentul unic de program
FNDRL	– Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
GIZ	– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
GNL	– Grupul Național de Lucru
IMSP	– Instituția Medico-Sanitară Publică
IRMIR	– Institute of Urban and Regional Development
IT	– Tehnologia de informație
ÎM	– Întreprinderi municipale
MIDR	– Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
MD	– Moldova
MDS	– Management al Deșeurilor Solide
MOODLE	– Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
ONG	– Organizații non-guvernamentale
OS	– Obiectivul specific
PAF	– Planul Anual de Finanțare
PCTT	– Programul de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională
PIB	– Produsul intern brut
PNDL	– Programul Național de Dezvoltare Locală
PNDOPC	– Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere
PMUD	– Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
POL	– Planul Operațional Local
POR	– Programul Operațional Regional
RDG	– Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia
PRS	– Programul Regional Sectorial
REDI	– Regional Economic Development Institute
RD	– Regiunea de Dezvoltare
RM	– Republica Moldova
RO	– România
SAASM	– Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova
SBC	– Strong Businesses and Communities for Moldova
SFPL	– Solidarity Fund din Polonia în Republica Moldova
SNDR	– Strategia Națională de Dezvoltare Regională
SRL	– Societate cu Răspundere Limitată
TİKA	– Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare
UE	– Uniunea Europeană
UIP	– Unitatea de Implementare a Proiectelor
UTA	– Unitatea teritorial autonomă
USC	– Universitatea de Stat din Comrat
ZEL	– Zona Economică Liberă

Sumar executiv

Raportul de progres privind implementarea Programul Operațional Regional (POR) UTA Găgăuzia 2022-2024 (prelungit până în 2025) este elaborat în baza Planului de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anul 2025, se constituie într-un document de sinteză și tranziție, care reflectă stadiul implementării proiectelor în anul 2025 și asigură coerența între rezultatele obținute în perioada precedentă și direcțiile strategice asumate pentru etapa următoare de dezvoltare regională și reflectă principalele rezultatele obținute în procesul de implementare pe parcursul anului 2025.

Raportul reflectă progresele realizate la nivelul fiecărui obiectiv specific precum și remarcă principalele riscuri, lecții învățate și bune practici identificate în perioada de raportare. Anul 2025 a avut un rol esențial în asigurarea continuității politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia, fiind orientat atât spre finalizarea, implementarea și inițierea proiectelor aprobate în cadrul Documentului Unic de Program (DUP) 2025–2027, cât și spre pregătirea instituțională.

În vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite în POR UTA Găgăuzia, în perioada de raportare au fost depuse eforturi comune de către factorii implicați în procesul de dezvoltare regională: ADR UTA Găgăuzia, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, APL de nivelul I, partenerii de dezvoltare și părțile interesate în regiune ș.a.

Prin prisma obiectivelor specifice stabilite în POR UTA Găgăuzia pot fi remarcate principalele rezultate obținute în perioada de raportare:

Pentru OS 1. Creșterea competitivității economiei a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia:

În domeniul consolidării rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii:

Proiect: „Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat” Statut actual : Finalizat și Transmis Beneficiarului

- **Finalizarea procedurilor de achiziție:** În urma demersurilor către Agenția Achiziții Publice, a fost obținut avizul pozitiv pentru modificarea contractului de antrepriză și acceptarea volumelor de lucrări substituite.
- **Recepția lucrărilor:** Lucrările au fost executate integral de către antreprenorul SRL „Valdcongrup”, fiind semnat Actul de recepție la terminarea lucrărilor în prezența Comisiei de recepție și a reprezentanților Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Construcțiilor la data de 3 septembrie 2025.
- **Indicatori tehnici realizați:**
 - Construcția a 4,47 km (4.470 metri) de rețele de canalizare.
 - Instalarea a 90 de fântâni de canalizare.
 - Asigurarea accesului la servicii de canalizare pentru 1.173 de cetățeni (391 de gospodării).
- **Finalizarea financiară:**
 - Soldul de finanțare de 840 mii lei, care figura ca restanță la 01.07.2025, a fost valorificat integral după primirea avizului AAP.
 - Suma totală achitată din sursele FNDRL pentru acest proiect constituie 2.230,80 mii lei.
- **Transferul investiției:** În octombrie 2025, setul complet de acte privind costurile investiționale a fost format, semnat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și transferat oficial către beneficiarul final, Primăria municipiului Comrat.

Proiectul Băncii Mondiale: „Siguranța alimentării cu apă și sanitație în Moldova” (SAASM)

- Activitățile au avansat semnificativ prin trecerea de la etapa de planificare la cea de execuție:
- Lansarea lucrărilor Cahul-Vulcănești: În urma unei noi ședințe a comisiei de evaluare, a fost desemnat câștigătorul licitației pentru execuția lucrărilor în cadrul subproiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul și orașul Vulcănești”.
- Demararea execuției: Lucrările de construcție a conductei de aducțiune au fost lansate oficial, marcând o etapă critică în asigurarea securității apei pentru regiune.
- Monitorizare și Supraveghere: A fost desemnat operatorul responsabil pentru serviciile de supraveghere tehnică, asigurându-se controlul calității pe tot parcursul procesului de construcție. Managementul proiectului: ADR UTA Găgăuzia a facilitat în total 5 ședințe de lucru pentru coordonarea măsurilor investiționale destinate municipiului Comrat și orașului Vulcănești. Implicare Instituțională: ADR UTA Găgăuzia a asigurat suportul tehnic și consultativ în toate etapele de colectare a datelor și consultare publică pentru aceste documente.

În perioada de raportare au avut loc 4 ședințe ale grupului de lucru privind dezvoltarea urbană integrată a mun. Comrat creat în cadrul proiectului GIZ/SBC. În cadrul ședințelor de lucru au fost examinate aspecte ce vizează elaborarea cu suportul proiectului GIZ/SBC a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru mun. Comrat și a Studiului de fezabilitate pentru modernizarea transportului public din municipiul Comrat.

În domeniul îmbunătățirii mediului antreprenorial în regiune:

Complexul turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”

Implementarea proiectului a depășit faza de așteptare administrativă, fiind înregistrate următoarele progrese:

- **Plăți și finanțare:** Suma de 2 401 mii lei, care era în așteptare pentru lucrările executate conform noii documentații, a fost procesată și achitată din sursele FNDRL.
- **Statut administrativ:** Procedura de prelungire a contractului de antrepriză a fost finalizată pe 19 decembrie 2025, permițând închiderea tuturor etapelor de execuție rămase.
- **Lucrări realizate:** S-au finalizat instalarea plăcilor decorative, a sistemelor sanitare, a tencuielii și a geamurilor.

În perioada de raportare a avut loc 2 ședințe a Grupului de lucru în domeniul dezvoltării economice locale, constituit în cadrul proiectului GIZ/SBC.

În domeniul identificării și promovării priorităților de specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Cu suportul financiar din partea GIZ în cadrul proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova” a fost elaborat documentul ”Studiul privind specializarea inteligentă în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia”. La data de 27 februarie 2025, în cadrul ședinței CRD UTA Găgăuzia, a fost audiat și aprobat Studiul de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. Acest document a definit 3 domenii de specializare intelectuală pentru RD Găgăuzia:

- Tehnologii textile avansate și materiale durabile;
- Chimie avansată și produse biofarmaceutice pentru sănătate și îngrijire;
- Agro-industrie.

În domeniul sprijinului pentru cooperarea regională și transfrontalieră:

- Participarea la 7 evenimente de informare privind programele de cooperare transfrontalieră.

- Participarea la 2 online traininguri «Interreg Programmes 2021–2027», Programme Evaluation, în cadrul DG REGIO C4C project.
- 2 formulare din cadrul Programului URBACT pentru Rețelele de Transfer de exprimare a interesului în parteneriat au fost completate.
- 3 chestionare completate privind progresele înregistrate între 1 septembrie 2024 și 31 martie 2025, în conformitate cu Instrucțiunea 1/2025 privind metodologia de elaborare și prezentare a contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere 2025.
- 2 Vizite de studiu în cadrul proiectului «Suport pentru administrația publică din Moldova în procesul de aderare în UE domeniul gestionării fondurilor europene», Varșovia, Polonia.
- 1 Vizita de studiu în Republica Cehă, în cadrul proiectului GIZ/SBC.

Pentru OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială:

În domeniul dezvoltării infrastructurii de suport pentru afaceri în regiune:

Proiect: „Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și a regiunii”

În perioada de raportare, a continuat implementarea proiectului strategic ce vizează crearea a **5 200 m²** de spații de producție. După finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractului de antrepriză cu compania S.A. „Colass” în noiembrie 2024, lucrările au demarat conform graficului stabilit.

- **Valorificare financiară:** Până în prezent, au fost executate și achitate lucrări în valoare de **20 955 660 lei** din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- **Lucrări executate:**
 - Au fost realizate lucrările de amenajare a teritoriului și planificarea verticală a amplasamentului.
 - S-au finalizat lucrările de terasament, excavarea gropii de fundație și consolidarea solului prin coloane de balast.
 - A fost executată turnarea fundațiilor și a pardoselilor clădirii.
 - S-a finalizat asamblarea integrală a structurii de rezistență metalice (coloane și ferme).
 - A început montarea panourilor termoizolante de tip sandwich pentru pereți și acoperiș, acestea fiind instalate parțial.
- **Statutul actual:** În prezent, lucrările sunt suspendate pentru perioada de iarnă, fiind semnat un acord adițional de prelungire a contractului din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și darea în exploatare a obiectivului sunt planificate pentru **primul trimestru al anului 2026**.

În perioada de raportare, a continuat colaborarea cu proiectul **”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova”**. În special au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- **Subproiectul pentru municipiul Comrat:** Acesta prevede construcția stației de epurare a apelor uzate și extinderea rețelelor de canalizare. Deși a fost inițiat procesul de achiziție publică pentru serviciile de proiectare în baza criteriilor tehnice stabilite de grupul de lucru, la moment, procesul este pus pe pauză.
- **or. Vulcănești:** Subproiectul pentru aprovizionarea cu apă a intrat în faza de implementare. Au fost organizate două ședințe de lucru cu antreprenorul și o întâlnire cu reprezentantul serviciului de supraveghere tehnică pentru coordonarea graficului de execuție și controlul calității

Pentru OS 3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de Dezvoltare Regională:

În domeniul sporirii eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională:

- Au fost desfășurate 2 ședințe ale CRD în cadrul cărora au fost aprobate 8 decizii.
- 10 specialiști din cadrul ADR UTA Găgăuzia au participat la 57 activități de instruire.
- 2 proiecte privind dezvoltarea orașelor, revitalizarea economică și socială a orașelor, dintre care 1 proiect a fost finalizat în totalitate, iar cel de-al doilea proiect este în curs de implementare.
- Au fost organizate 3 seminare de informare pentru APL în cadrul cererilor candidaților pentru proiectele regionale finanțate de FNDRL care au ajuns la etapa a doua a competiției.
- 16 note conceptuale depuse de către APL din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia și 6 note conceptuale aprobate (concurs din FNDRL, ediția 2024);
- 5 note conceptuale depuse ADRG (2 concursuri pe listă din FNDRL, ediția 2025);
- Au fost elaborate 5 rapoarte de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională.
 - „Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin aplicarea formelor hibride de educație”;
 - „Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare”.
 - „Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate mun. Comrat”.
 - Amenajarea și conectarea la infrastructura comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat.
 - Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești.

În domeniul sprijinului consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională/locală:

Volumul contribuțiilor alocate de către APL.

În 2023, contribuția a fost alocată în valoare totală de 6 575,02 mii lei. Contribuția a fost alocată pentru următoarele proiecte:

- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și a regiunii – 5 610,52 (mii lei)
- Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” - 964,50 (mii lei)

În 2024, contribuția a fost alocată în valoare totală de 2 374,28 mii lei:

- Amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul "Tukaneasca", mun Comrat - 1 106,71 (mii lei)
- Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de Cultură din orașul Vulcănești UTA Găgăuzia - 798,051 (mii lei)
- Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujie din mun. Comrat. - 469,52 (mii lei).

În 2025, contribuția a fost alocată în valoare totală de 9 777,86 mii lei:

- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și a regiunii – 8 350,52 (mii lei).
- Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de Cultură din orașul Vulcănești UTA Găgăuzia - 1 427,366 (mii lei).

În 2026, se preconizează că va fi alocată contribuția pentru 4 proiecte cu o valoare totală de 5 890,51 mii lei

- Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor geotermale și cu adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifuncționalal LT "Mihai Eminescu " din mun. Comrat UTAG - 193,315 (mii lei)
- Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiakov, Lenin - 1 671,398 (mii lei)
- Îmbunătățirea condițiilor de viață și a acordului pentru locuitorii zonei de revitalizare a municipiului Ceadâr-Lunga. Etapa 3 - 879,732 (mii lei)
- Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Vulcănești. Etapa I - 3 146,066 (mii lei)

În anul 2025, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și locală rămâne principala sursă de implementare a proiectelor de Dezvoltare Regională. Dinamica alocării financiare este prezentată în Figura 1.

Figura 1. Dinamica alocărilor financiare din FNDRL destinate RD UTA Găgăuzia pentru anii 2022-2025 (mii lei)



Sursa: Deciziile CNCDDL privind alocarea mijloacelor financiare din FNDRL

Pentru anul 2025 pentru implementarea ai 5 proiecte regionale din DUP 2022-2024, prin Decizia CNCDDL Nr. 85 din 10.12.2025 a fost alocată din FNDRL suma de 39 269,39 mii lei. Din suma alocată, în perioada de raportare au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 39 259,2 mii de lei sau 99,97% din suma alocată pentru anul 2025. Situația privind valorificarea mijloacelor financiare al anului 2025 este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Valorificarea mijloacelor financiare alocate din FNDRL pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională în RD UTA Găgăuzia (mii lei).

Denumirea proiectului	Cost total	Cost total, (FNDRL)	Contractat	Aprobat pe finanțare 2025 (FNDRL)	Valorificat 2025 (FNDRL)	Gradul de valorificare
Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”	17 199,4	15 270,3	16 390,78	2402,7	2401,95	99.97%

<i>Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postrincubare a rezidenților incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și a regiunii</i>	36 500,0	22 500,0	20 955,66	20 955,66	20 955,33	100%
<i>Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de Cultură din orașul Vulcănești UTA Găgăuzia</i>	15 961,0	14 364,9	14 245,8	9 987,31	9 978,30	99.91%
<i>Amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul Tukaneasca, mun. Comrat</i>	15 796,7	14217,06	11 067,19	3692,88	3692,88	100%
<i>"Construcția rețelelor de canalizare în cartierul Zaialpujie din mun. Comrat"</i>	6 211,68	5590,5	4 695,27	2 230,84	2 230,84	100%
TOTAL	75 872,08	57 725,7	67 354,7	39 269,39	39 259,3	99.97%

Sursa: ADR UTA Găgăuzia

În perioada de raportare a continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare care activează în regiune. Ca parteneri de bază pot fi menționați:

- Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului "Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova" (SBC);
- Fundația "Solidarity Fund" / Polish(Polonia);
- IRMIR
- Banca Mondială;
- PRIM (Piețe reziliente și incluzive în Moldova/United Nations Development Programme)
- Institutului de Ecologie și Geografie RM

Pentru perioada următoare principalele acțiuni vor fi orientate spre următoarele domenii:

- Acordarea suportului pentru mun. Comrat în vederea elaborării propunerilor de proiecte în contextul implementării Programului de dezvoltare a orașelor poli de creștere;
- Asigurarea continuității implementării proiectelor de dezvoltare regională inițiate în regiune;
- Consolidarea capacităților APL și CRD, CRS în domeniul planificării strategice și managementului proiectelor

Introducere

Programul Operațional Regional este principalul document de planificare la nivelul Regiunii de dezvoltare, care este conceput pentru a asigura alinierea între Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2022–2028 și activitățile planificate la nivel regional. Documentul transferă obiectivele SNDR la nivelul Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia (RDG) care determină mijloacele de intervenție și prioritățile pe termen mediu în funcție de nevoile de dezvoltare ale regiunii și de problemele inerente nivelului regional, fiind un instrument de utilizare mai eficientă a potențialului regional pe termen mediu.

Programul Operațional Regional al Regiunii de Dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2022–2024 (prelungit până în 2025), definește principalele orientări pentru dezvoltarea UTA Găgăuzia

ca Regiune de Dezvoltare pe termen mediu. POR a fost elaborat în conformitate cu documentele fundamentale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării regionale:

- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 „Cu privire la dezvoltarea regională”;
- Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”;
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 2022–2028;

Programul a fost elaborat în conformitate cu cerințele unificate pentru elaborarea documentelor de program (Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020), precum și cu principalele cerințe metodologice determinate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Ordinul MADRM nr.26 din 12.02.2021).

Pe parcursul perioadei de raportare ianuarie – decembrie 2025 activitățile, în vederea implementării Programul Operațional Regional, au fost desfășurate în conformitate cu Planul de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anul 2025 și în conformitate cu Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2025. Implementarea măsurilor în vederea atingerii obiectivelor specifice a fost realizată atât în colaborare cu autoritățile publice centrale și prin coordonare cu principalii factori cointeresați din regiune: Consiliul Regional pentru Dezvoltare, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, primăria mun. Comrat și alte APL, organizații neguvernamentale (ONG) și mediul științific (USC– Universitatea de Stat din Comrat) din regiune cât și prin conlucrarea eficientă cu partenerii de dezvoltare.

Prin urmare, toate activitățile desfășurate în perioada de raportare au rezultat din obiectivele generale și direcțiile prioritare stabilite în POR UTA Găgăuzia 2022-2025.

Principalele rezultate atinse în perioada de raportare în procesul de implementare a POR UTA Găgăuzia

Obiectivul general: Creșterea competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor.

În conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 2022–2028, unul dintre principale obiective strategice se referă la sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, eliminarea inegalităților și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În conformitate cu aceasta, obiectivul principal al Programului Operațional Regional 2022–2024 (prelungit până în 2025) este: Sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a regiunii UTA Găgăuzia, eliminarea inegalităților și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

În vederea atingerii obiectivului strategic de dezvoltare regională în regiunea UTA Găgăuzia, POR 2022-2024 este focusat pe următoarele trei obiective specifice:

- OS 1. Creșterea competitivității economiei Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia;
- OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială;
- OS 3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de Dezvoltare Regională.

Pentru fiecare dintre obiectivele specifice este stabilit un set de măsuri concrete menite să contribuie la realizarea acestora.

În continuare sunt prezentate principalele rezultate atinse în perioada de raportare în corespundere cu obiectivele specifice și măsurile stabilite în POR 2022-2024 și avînd în vedere planul de implementare a POR-ului pentru anul 2025.

Obiectivul Specific 1: Creșterea competitivității economiei Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia.

La nivelul regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia, măsurile de implementare a acestui obiectiv vizează consolidarea rolului și funcțiilor orașelor ca forțe motrice pentru creșterea competitivității regiunii, îmbunătățirea mediului de afaceri din regiune, precum și identificarea și promovarea specializării inteligente în regiune.

Măsura 1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii UTA Găgăuzia.

Activitățile legate de această măsură se concentrează pe următoarele priorități:

1. Dezvoltarea municipiului Comrat - ca oraș-pol de creștere.
2. Revitalizarea orașelor și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Dezvoltarea mun. Comrat ca oraș - pol de creștere.

Una dintre principalele provocări pentru îmbunătățirea competitivității regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia este situația socio-economică a orașelor regionale, concepute să acționeze ca centre de competitivitate și poli de creștere. Pentru a consolida rolul orașelor ca forță motrică pentru competitivitatea regiunii, sunt utilizate oportunitățile care au apărut odată cu adoptarea Programului Național pentru dezvoltarea orașelor poli de creștere 2021-2027. În vederea susținerii dezvoltării mun. Comrat ca oraș pol de creștere, activitatea ADR UTA Găgăuzia în anul 2025 a vizat implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor pol de creștere pentru perioada 2021-2027.

În perioada de raportare a continuat acordarea de sprijin orașelor din regiunea de dezvoltare în ceea ce privește dezvoltarea urbană. A fost acordat suport municipiului Comrat ca oraș – pol de creștere. În acest context, pe parcursul anului 2025, specialiștii ADR Gagauzia au oferit suport consultativ municipiului Comrat cu privire la oportunitățile de elaborarea concepte de proiecte, finanțare a proiectelor incluse în Planul Operațional Local și au facilitat prezența reprezentanților orașului-pol de creștere la evenimentele de informare și lansare a concursurilor de finanțare din fondurile naționale și internaționale.

Au avut loc 26 ședințe de lucru cu autoritățile locale din regiune privind dezvoltarea urbană. Au fost acordate 60 consultări către UIP al primăriei Comrat. De asemenea reprezentanții APL Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești au participat la diverse instruire și training-uri în vederea consolidării capacităților în domeniul dezvoltării urbane. În perioada de referință, specialiștii din cadrul APL urbane au participat la un set de traininguri, care a fost organizat de ADR UTAG.

Totodată, pe parcursul anului 2025, angajații ADR au participat în procesul de evaluare a progresului privind implementarea Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere și actualizarea ulterioară a acestuia. Această activitate a fost realizată cu suportul tehnic al proiectului GIZ ”Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”. Au fost colectate informațiile necesare pentru evaluarea progresului de implementare a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere pentru anii 2021-2027. În acest context a fost acordată asistență UIP din mun. Comrat în procesul de colectare a datelor și completarea chestionarelor privind evaluarea implementării PNDOPC 2021-2027. A fost elaborat un raport privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 privind Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere pentru perioada 2021-2027 de către municipiul Comrat. La data de 05.02.2025 – specialiștii din cadrul ADR UTA Găgăuzia au participat la evenimentul de Consultare Publică „Ajustarea Programului Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de Creștere” pe baza concluziilor și recomandărilor expuse în Raportul de Evaluare Intermediară.

De remarcat faptul că Portofoliul de proiecte pentru municipiul Comrat trebuie ajustat, ținând cont de solicitarea administrației publice locale de a înlocui proiectul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare destinat facilitării investițiilor private în construcția unui nou cartier de blocuri locative cu un proiect nou, respectiv construcția unui complex sportiv multifuncțional de importanță regională. Acest proiect reprezintă o prioritate și necesitate majoră pentru municipiu, astfel încât să îndeplinească criteriile minime legale necesare pentru a fi definit ca oraș cu statut de municipiu.

În domeniul dezvoltării urbane, în perioada anului 2025, municipiul Comrat a beneficiat de suport din partea GIZ în cadrul proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova” (SBC), (Componenta Dezvoltare Urbană Integrată și Componenta Dezvoltare Economică). În rezultatul implementării acestui proiect au fost obținute următoarele rezultate:

a) În cadrul APL Comrat a continuat activitatea Grupului de lucru pentru dezvoltare urbană integrată, responsabil de coordonarea, monitorizarea și evaluarea eficacității și calității implementării intervențiilor de dezvoltare urbană integrată;

b) În cadrul atelierelor de lucru cu participarea membrilor Grupului de lucru pentru dezvoltare urbană integrată, au fost examinate aspecte ce vizează elaborarea cu suportul proiectului GIZ/SBC a Planului de mobilitate urbană durabilă pentru mun. Comrat și a Studiului de fezabilitate pentru modernizarea transportului public din municipiul Comrat. Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia a fost implicată activ în toate acțiunile menționate.

În cadrul acestui proiect, ADR UTA Găgăuzia a participat la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare pentru mun. Comrat:

La data 20.02.2025 - a participat în ședință de lucru, care a fost organizată în cadrul inițiativei de elaborare a unui plan de adaptare la schimbările climatice și reducere a riscului de dezastre naturale al mun. Comrat.

La data 06.03.2025 –a participat la ședința grupului de lucru pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Comrat: verificarea situației actuale în domeniul mobilității urbane. 03.04.2025 – Ședința grupului de lucru. Subiect: Prezentarea și discutarea versiunii preliminare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea serviciilor de transport public în municipiul Comrat.

29.05.2025 - Consultări publice în cadrul procesului de elaborare a studiului de fezabilitate tehnico-economică privind modernizarea transportului public în municipiul Comrat.

25.06.2025 – Ședința grupului de lucru. Subiect: Prezentarea versiunii preliminare a PMUD Analiza situației actuale, viziune și obiective, modelare transport și evaluare scenarii, prezentare generală a proiectelor (măsurilor) cheie propuse în cadrul PMUD.

Reprezentanților centrelor urbane din regiunea de dezvoltare ATO Gagauzia li s-au oferit în mod constant consultanță cu privire la revitalizarea urbană, precum și la propunerile de proiecte ale orașelor.

A fost pregătită informația necesară pentru analiza celor trei Programe privind revitalizare urbană a Regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia , rezultatul acestei analize constă în evaluarea măsurii în care unitățile spațiale definite în Planurile Generale de Dezvoltare (PGD) sunt potrivite pentru scopurile de revitalizare sau dacă sunt necesare metode alternative de delimitare a acestora.

Au avut loc 3 ședințe de lucru ale grupului analitic, cu participarea unui expert din Polonia, în cadrul cărora au fost discutate aspecte importante, inclusiv dacă planurile generale de dezvoltare ale orașelor existente sau aflate în elaborare (PGD) pot constitui o bază adecvată pentru determinarea acestor unități. În regim de lucru, reprezentanților centrelor orașelor din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia au fost oferite consultări pe probleme de revitalizare urbană, precum și cu privire la propunerile de proiecte ale orașelor.

La 24.07.2025, reprezentanții ADR UTA Găgăuzia au participat la consultările publice privind planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Comrat. De asemenea, au participat la prezentarea și discutarea versiunii finale a studiului de fezabilitate tehnico-economică privind modernizarea transportului public în orașul Comrat.

28–29.10.2025 - instruirii în domeniul revitalizării urbane, reprezentanții din cadrul ADRG și APL;

10.11.2025 - ședința online referitor la actualizarea Liniilor de revitalizare urbană/Raportul analitic, elaborat de partenerii IRMiR, privind modul în care Orientările privind revitalizarea urbană în Republica Moldova

14.11.2025 - participarea în ședința de lucru al Comisiei Consultativă de Revitalizarea Urbană mun. Ceadâr-Lunga

21.11.2025 - participarea în ședința de lucru al Consiliul de Coordonare de Revitalizarea Urbană mun. Ceadâr-Lunga

11-12.2025 participarea la trainingul referitor la RU și rezumatul la Liniile directoare pentru Revitalizarea Urbană

În ce privește implementarea proiectelor de dezvoltare urbană, pot fi menționate următoarele activități semnificative:

- Proiectul „**Extinderea rețelelor urbane de canalizare în cartierul „Tanc”**”, cu un cost estimat de 9 307,67 mii lei, a fost implementat integral. Componenta de construcție a proiectului a fost finalizată în anul 2024. În rezultat, au fost construiți **7,7 km de rețele gravitaționale de canalizare, 1,2 km de rețele de canalizare sub presiune și o stație de pompare** cu o capacitate de 34m³/24h. În anul 2025, a avut loc recepția finală a lucrărilor. Toate costurile aferente proiectului au fost documentate și transmise beneficiarului final, Primăria municipiului Comrat.
- ADR UTA Găgăuzia a participat la 5 ședințe ale grupurilor de lucru din mun. Comrat „Format participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri din mun. Comrat și Grupul de Lucru pentru Dezvoltare Urbană Integrată mun. Comrat.



Imaginea 1, 2,3. Proiect „Extinderea rețelelor urbane de canalizare în cartierul „Tanc” a municipiului Comrat”

- Proiectul „**Construcția rețelelor de canalizare în cartierul Zaialpujie din mun. Comrat**” . Proiectul a fost finalizat cu succes în perioada de raportare, lucrările de construcție fiind executate integral în conformitate cu documentația tehnică verificată. Acesta a reprezentat un obiect
- v major pentru îmbunătățirea infrastructurii edilitare din municipiu.

Principalele repere ale finalizării proiectului:

- **Recepția lucrărilor:** Procesul de recepție la terminarea lucrărilor a fost realizat cu succes în luna **septembrie 2025**, cu participarea reprezentanților Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.
- **Transferul investiției:** În luna **octombrie 2025**, au fost finalizate toate procedurile administrative, iar costurile investiționale au fost transmise oficial către beneficiar, Primăria mun. Comrat.

- **Rezultate tehnice:** Rețeaua de canalizare a fost extinsă cu **4,47 km**, incluzând instalarea a **90 de fântâni** de vizită.
- **Impact social:** Prin finalizarea acestui proiect, a fost asigurat accesul la servicii moderne de sanitație pentru **1 173 de cetățeni** (391 de gospodării) din sectorul Zayalpujie.
- **Conformitate:** Proiectul a inclus acceptarea și verificarea tuturor lucrărilor substituite, primind avizul pozitiv din partea Agenției Achiziții Publice, ceea ce a permis închiderea financiară corectă a obiectivului.

Finalizarea acestui proiect la sfârșitul anului 2025 reprezintă un succes important în atingerea obiectivelor de dezvoltare regională, demonstrând eficiența colaborării dintre Agenție, autoritățile locale și instituțiile de control în beneficiul direct al populației.



Imaginea 4, 5. Proiect „Construcția rețelelor de canalizare în cartierul Zayalpujie din mun. Comrat”

Revitalizarea orașelor și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

În scopul îmbunătățirii calității vieții și reducerii disparităților de dezvoltare, în regiune se implementează Programe de Revitalizare Urbană (PRU).

Toate cele trei orașe din UTA Găgăuzia dețin Programe de Revitalizare Urbană aprobate, al căror termen de valabilitate expiră în anul 2025. Tot în această perioadă au început lucrările la elaborarea a două noi Programe de Revitalizare Urbană: pentru municipiul Ceadâr-Lunga și orașul Vulcănești. În acest context, accentul principal a fost pus pe implementarea măsurilor planificate. În regim de lucru, reprezentanților orașelor din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia au fost oferite consultări pe probleme de revitalizare urbană, precum și cu privire la propunerile de proiecte ale orașelor - în perioada de raportare, primăriilor din regiune le-a fost acordat suport consultativ și metodologic, fiind organizate 12 ședințe de lucru cu 71 participanți și 44 consultări oferite. Reprezentanții centrelor orașelor din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia au fost oferite consultări pe probleme de revitalizare urbană, precum și cu privire la propunerile de proiecte ale orașelor. A fost pregătită informația necesară pentru analiza celor trei Programe privind revitalizare urbană a Regiunii de dezvoltare Găgăuzia, rezultatul acestei analize constă în evaluarea măsurii în care unitățile spațiale definite în Planurile Generale de Dezvoltare (PGD) sunt potrivite pentru scopurile de revitalizare sau dacă sunt necesare metode alternative de delimitare a acestora.

Au avut loc 3 ședințe de lucru ale grupului analitic, cu participarea unui expert din Polonia, în cadrul cărora au fost discutate aspecte importante, inclusiv dacă planurile generale de dezvoltare (PGD) ale orașelor existente sau aflate în elaborare pot constitui o bază adecvată pentru determinarea acestor unități.

28–29.10.2025 - instruirii în domeniul revitalizării urbane, reprezentanții din cadrul ADRG și APL;

10.11.2025 - ședința online referitor la actualizarea Liniilor de revitalizare urbană/Raportul analitic, elaborat de partenerii IRMiR, privind modul în care Orientările privind revitalizarea urbană în Republica Moldova

14.11.2025 - participarea în ședința de lucru al Comisiei Consultativă de Revitalizarea Urbană mun. Ceadâr-Lunga

21.11.2025 - participarea în ședința de lucru al Consiliul de Coordonare de Revitalizarea Urbană mun. Ceadâr-Lunga

11.12.2025 participarea la trainingul referitor la revitalizarea urbană și rezumatul la Liniile directoare pentru revitalizarea urbană

Tot în 2025, cu ajutorul experților IRMiR din Polonia, a fost lansat un proces de actualizare și îmbunătățire a principalului document programatic privind revitalizarea urbană - Liniile directoare pentru Revitalizarea Urbană în RM.

Rezultatele implementării proiectelor de revitalizare urbană:

- **În anul 2025:** S-au aflat în proces de implementare **2 proiecte**, valoarea totală a cărora constituie **25 313 mii lei**.

Tabelul 2. Implementarea proiectelor de revitalizare urbană.

Nr.	Denumirea proiectului	Cost total al proiectului Contractat, mii.lei	Suma solicitată din sursele FNDRL, în anul 2025, mii.lei	Cofinanțare a beneficiar, în anul 2025, mii.lei	Statutul proiectului
1	<i>„Spațiul de interacțiune: îmbunătățirea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal din zona Tucaneasca a municipiului Comrat”.</i>	11 067,2	3692,88	0,0	finalizat
2	<i>„Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației prin repararea clădirii Casei de Cultură din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.”</i>	14 245,8	9 987,31	1 427,366	În proces de implementare
Total proiecte în domeniul RU finanțate din sursele FNDRL		25 313	13 680,19	1 427,366	

Sursa: ADR UTA Găgăuzia

Proiect: „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației prin repararea clădirii Casei de Cultură din orașul Vulcănești”

În anul 2025, proiectul a intrat în etapa finală, înregistrând progrese majore atât la nivelul infrastructurii de bază, cât și al finisajelor estetice și dotărilor exterioare.

Activități suplimentare realizate în perioada de raportare:


- **Lucrări exterioare și amenajarea teritoriului:**

- A fost demontată vechea acoperire asfaltică pe o suprafață de **2 200 m²** pentru pregătirea procesului de modernizare a spațiului adiacent.
- S-a finalizat termoizolarea fațadei pe o suprafață de **1 750 m²**, urmată de aplicarea finisajului exterior.
- Au fost instalate elemente de mobilier urban, constând în **17 bănci și 17 stâlpi de iluminat** (felinare), depășind estimările inițiale de dotare a zonei de recreere.

- **Lucrări interioare și finisaje decorative:**

- Au fost finalizate lucrările decorative complexe în **foaier și în sala de festivități**, oferind clădirii un aspect estetic modern și primitor.
- S-au executat pardoselile: în sala de festivități a fost aplicată o acoperire nouă, iar în foaier a fost montată **placă de gresie porțelanată (keramogranit)** de înaltă rezistență.
- A fost finalizat montajul integral al **rețelelor electrice** pentru întreaga clădire, inclusiv instalarea corpurilor de iluminat și a sistemului de semnalizare în caz de incendiu.
- S-au montat ușile interioare și au fost finalizate grupurile sanitare moderne în interiorul instituției.
- În sala de festivități au fost instalate coloane noi și elemente de sprijin pentru sistemul de iluminat profesional.

Statutul actual: În prezent, proiectul este practic finalizat, fiind executat și achitat un volum de lucrări de aproximativ **9 978,30 mii lei** din sursele FNDRL în cursul anului 2025. Procedura oficială de recepție la terminarea lucrărilor și darea în exploatare a obiectivului sunt planificate pentru **primul semestrul al anului 2026**.

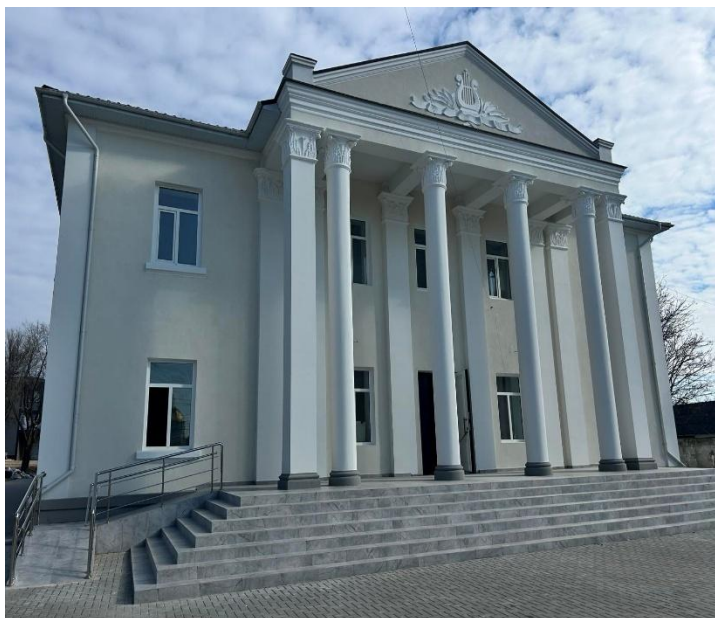

Imaginea 6,7. Proiect „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației prin repararea clădirii Casei de Cultură din municipiul Vulcănești, UTA Găgăuzia.”

Proiect: „Spațiul de interacțiune: îmbunătățirea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în zona Tucaneasca, mun. Comrat”

Acest proiect a fost finalizat cu succes în proporție de **100%**, atingând toate obiectivele stabilite pentru îmbunătățirea calității vieții celor 3 821 de locuitori din cartierul vizat.

Rezultate obținute și indicatori realizați:

- **Infrastructură rutieră și pietonală:**

- A fost construit un sector de drum cu lungimea de **820 de metri** și lățimea de **5,5 metri**.
- A fost amenajat un trotuar nou cu lățimea de **1,5 metri** pe întreaga lungime a sectorului.

- **Obiective sportive și de recreere:**

- Au fost amenajate **2 terenuri de sport** moderne.
- Un teren de fotbal (36 m x 56 m) dotat cu gazon artificial, garduri de protecție și porți.
- Un teren polivalent pentru baschet și volei.

- **Amenajarea teritoriului și mobilier urban:**

- Au fost instalate **29 de bănci** pentru odihnă și **29 de coșuri de gunoi**.
- S-au montat garduri de protecție, panouri informative și s-au realizat lucrări de înverzire (gazon) în zona parcului.

Statutul administrativ și financiar la finalul anului:

- **Recepția lucrărilor:** Actul de recepție finală a fost semnat la data de **2 septembrie 2025**.
- **Transferul investiției:** Toată documentația necesară pentru transmiterea costurilor investiționale către beneficiar (Primăria mun. Comrat) a fost finalizată și depusă în luna **octombrie 2025**.
- **Valorificare financiară:** Din sursele FNDRL, pentru acest proiect au fost achitate **3 692,81 mii lei** în perioada de raportare.

Proiectul reprezintă un exemplu de bună practică în revitalizarea urbană, oferind comunității un spațiu modern de interacțiune socială și activități sportive.



Imaginea 8,9. Proiect „Spațiul de interacțiune: îmbunătățirea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal din zona Tucaneasca a municipiului Comrat.”

Proiect: Proiectarea sistemului de încălzire cu utilizarea pompelor geotermale și cu adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifuncțională LT "Mihai Eminescu" din mun. Comrat

În pofida celor două tentative de inițiere a procedurilor de achiziție în anul 2025, proiectul privind implementarea sistemului de încălzire geotermala la LT „Mihai Eminescu” (mun. Comrat) a fost amânat pentru anul 2026, din cauza neconformității participanților cu criteriile privind experiența specifică. Situația a scos în evidență un deficit de cadre calificate în sectorul energiei geotermale pe piața locală,

fapt ce impune o monitorizare sporită și, eventual, o adaptare a condițiilor de licitație în următorul ciclu pentru a asigura valorificarea cu succes a investițiilor.



Imaginea 10. Proiect: «Proiectarea sistemului de încălzire cu utilizarea pompelor geotermale și cu adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifuncțională LT "Mihai Eminescu " din mun. Comrat»

Măsura 1.2: Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Progresul în dezvoltarea regiunii poate fi atins, în mare parte, prin asigurarea creșterii economice durabile. Dezvoltarea economică constantă și echilibrată poate genera resurse financiare, ce pot fi reinvestite în regiune, inclusiv pentru ameliorarea problemelor sociale. Zonele de intervenție și măsurile planificate vin să stimuleze dezvoltarea sectorului economic al regiunii și să diminueze impactul celor mai grave probleme printre care: numărul redus de întreprinderi în regiune, gradul scăzut de ocupare a forței de muncă, rată înaltă a șomajului, exodul masiv al populației apte de muncă, ș.a.

POR UTA Găgăuzia pentru 2022-2024 stabilește țintele spre care vor fi orientate activitățile realizate în cadrul măsurii 1.2. Printre cele mai importante ținte se numără următoarele:

- Creșterea a PIB-ului regional pe cap de locuitor în medie cu cel puțin 5% anual;
- Creșterea volumului investițiilor private în regiune (inclusiv investiții externe) cu 25% până în 2024.

Conform datelor BNS (la situația anului 2024) numărul de întreprinderi mici și mijlocii în anul 2024 constituie - 7 552 întreprinderi în RM, și în UTA Găgăuzia numărul de întreprinderi mici și mijlocii constituie 237. Investiții în active imobilizate în UTA Găgăuzia în anul 2024 constituie - 952,6 mii. lei sau 2,3% la nivel național.

În POR 2022-2024 se acordă o atenție sporită îmbunătățirii mediului de afaceri în RD UTA Găgăuzia. Acest lucru este asigurat prin intervenții sistemice care vizează dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea atractivității turistice a regiunii. Măsurile și acțiunile vizează implementarea scopurilor și obiectivelor, care se reflectă și în PRS „Privind creșterea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia pentru 2019 – 2025”.

În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia funcționează 1 universitate, 2 colegii și 2 instituții de învățământ profesional tehnic secundar. Luând în considerare potențialul existent, este necesar de a asigura o mai mare flexibilitate a structurilor date în organizarea procesului de formare a forței de muncă calificate și dezvoltarea programelor de formare continuă (recalificare) în cadrul specialităților solicitate


pe piața forței de muncă din regiune. Atenție deosebită se acordă în regiune utilizării potențialului educațional al instituțiilor de învățământ în vederea acordării suportului în formarea continuă a specialiștilor din cadrul APL.

În contextul acestei măsuri, în cadrul ADR UTA Găgăuzia a fost format un grup de lucru pentru pregătirea Programului Regional Sectorial privind dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia pentru 2026-2030.

Reprezentanții ADR UTA Găgăuzia au participat la un training organizat în orașul Leova de GIZ, intitulat „Specializare inteligentă: strategii de dezvoltare economică locală și regională”.

În perioada de raportare, în vederea realizării Măsurii 1.2, a continuat colaborarea cu proiectul GIZ ”Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova” (SBC). În cadrul componentei 3 ”Dezvoltare economică locală” a proiectului respectiv, sunt planificate un șir de măsuri menite să contribuie la consolidarea capacității partenerilor locali în domeniul dezvoltării economice locale. ADR UTA Găgăuzia este implicată în implementarea acestui proiect prin participarea în cadrul grupului de lucru participativ creat în cadrul primăriei mun. Comrat. Scopul principal este de a acorda suport pentru îmbunătățirea condițiilor socio-economice în mun. Comrat prin: promovarea și implementarea unui set de măsuri de dezvoltare economică locală; susținerea contribuției sectorului privat la procesele și soluțiile mediului de afaceri al municipiului; sprijinirea implementării și îmbunătățirii serviciilor de afaceri pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici. În cadrul reuniunilor grupului de lucru au fost identificate un șir de concepte de proiecte de dezvoltare economică locală. Propunerile de proiecte au fost selectate pe baza criteriilor de calificare aprobate pentru măsurile din domeniul dezvoltării economice locale/regionale. Totodată ADR UTA Găgăuzia au participat la a șasea sesiunea informativă privind produsul financiar „FACEM Sustainable Investments BGK” în cadrul Incubatorului de Afaceri al orașului Ceadâr-Lunga.

Totodată în perioada 21–24 ianuarie, în cadrul proiectului Enricher „Elaborarea conceptului de turism verde prin instruire”, ADRG participat în calitate de expert la cea de-a treia serie de traininguri axate pe dezvoltarea turismului durabil în Georgia și Republica Moldova.

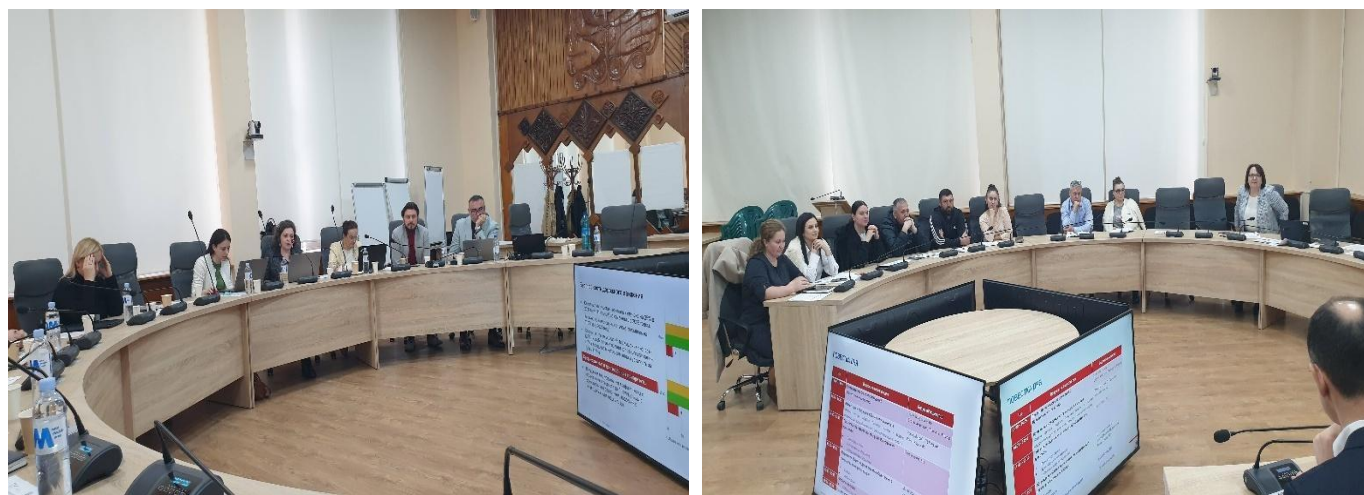

Imaginea 11,12. Ședința grupului de lucru în domeniul dezvoltării economice locale în cadrul proiectului GIZ/SBC

În cadrul măsurii 1.2 ”Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea **Proiect: „Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”**

În perioada de raportare, proiectul a intrat în faza finală de execuție, după reluarea lucrărilor la data de 30 iunie 2025, în baza documentației de proiect modificate și a contractului de antrepriză ajustat.

Evoluția proiectului la finalul anului 2025:

- **Finalizarea lucrărilor:** În luna decembrie 2025, a fost recepționată confirmarea oficială privind finalizarea tuturor lucrărilor de construcție planificate conform graficului actualizat.
- **Procedura de recepție:** În prezent, beneficiarul este în proces de colectare a avizelor și documentației necesare pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor.
- **Documentație de specialitate:** Se află în etapa de obținere concluziile finale și avizele de la instituțiile de resort, inclusiv de la Inspecția Ecologică, Serviciul de Protecție Împotriva Incendiilor, precum și raportul final din partea organizației de proiectare.
- **Statutul administrativ:** Proiectul se pregătește pentru darea oficială în exploatare, fiind asigurată conformitatea lucrărilor cu noile standarde tehnice aprobate după modificarea proiectului inițial.

Finalizarea execuției lucrărilor la sfârșitul anului 2025 reprezintă un pas decisiv pentru punerea în valoare a potențialului turistic și sportiv al regiunii prin intermediul complexului „AT-Prolin”.





Imaginea 13-16. Complexul turistic sportiv-ecvestru «AT-Prolin».

Măsura 1.3 Identificarea și promovarea priorităților de specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Măsura respectivă este axată pe sprijinirea sectoarelor cheie cu potențial de specializare inteligentă din RD UTA Găgăuzia, cu impact asupra creșterii economice prin sporirea gradului regional de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare și antreprenoriat.

Cu suportul financiar din partea GIZ în cadrul proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova” a fost elaborat documentul privind Specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia - ”Studiul privind specializarea inteligentă în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia”. Acest document a definit 3 domenii de specializare intelectuală pentru RD Găgăuzia:

- Tehnologii textile avansate și materiale durabile;
- Agro- industrie.
- Chimie avansată și produse biofarmaceutice pentru sănătate și îngrijire;



LANȚ VALORIC ALIMENTAR DURABIL ȘI INOVATIV

- *Industrie alimentară cu valoare adăugată înaltă în baza materiei prime locale*
- *Agricultură și Procesare Alimentară Circulară*



INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI DE CONFECȚII INOVATOARE ȘI FUNCȚIONALĂ

- *Tehnologii Textile Avansate și Materiale Durabile*
- *Producție Durabilă și Circulară în Industria Textilă și de Confecții*



BIOCHIMIE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU FARMACEUTICĂ ȘI ÎNGRIJIRE

- *Produse Cosmetice și de Îngrijire Ecologice pe bază resurselor unice locale*
- *Biotehnologii pentru Produse Farmaceutice*



Imaginea 17, 18. Domenii Prioritare și nișe pentru specializarea inteligentă

În data de 27 februarie 2025, în cadrul ședinței CRD UTA Găgăuzia, a fost audiat și aprobat Studiul de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. La data de 17 iulie 2025 Participarea la evenimentul Launching Event of the Smart Specialization program (S3) in the Republic of Moldova, cu genericul „Dialog strategic privind implementarea Programului Național de Specializare Inteligentă – „Smart Moldova”. A fost prezentată o prezentare privind specializarea inteligentă în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Măsura 1.4: Sprijin pentru cooperarea regională și transfrontalieră.

Cooperarea transfrontalieră este unul dintre cele mai importante elemente ale relațiilor UE cu vecinii săi, inclusiv Republica Moldova. Programele de cooperare transfrontalieră contribuie la dezvoltarea durabilă în regiunile adiacente granițelor externe ale UE, reducând decalajul dintre standardele de viață și rezolvând problemele comune de ambele părți ale graniței.

Un rol important în dezvoltarea cooperării transfrontaliere și în special, între euroregiuni, îl joacă alocarea de către Uniunea Europeană și organizațiile internaționale a unor sume semnificative destinate programelor de cooperare relevante.

Principala formă de cooperare transfrontalieră este participarea la programe de cooperare transfrontalieră finanțate de UE, printre care Programului Interreg NEXT VI-a România – Republica Moldova 2021–2027, URBACT IV pentru Rețelele de Transfer, Programul Operațional România-Republica Moldova etc.

Participarea regiunii la aceste programe oferă posibilitate de atragere a fondurilor suplimentare pentru implementarea sarcinilor legate de îmbunătățirea mediului înconjurător, a mediului de afaceri și a atractivității turistice, contribuind astfel la atingerea obiectivului principal al POR 2022-2024 în anul 2025.

Experiența statelor membre ale UE arată că, pentru ca cooperarea transfrontalieră să aibă succes, aceasta trebuie să funcționeze la toate nivelurile: național, regional și local. În Republica Moldova, mecanismul de cooperare transfrontalieră, există sub diferite forme, este eficient, iar avantajele sale sunt incontestabile.

În contextul cooperării transfrontaliere, ADR UTA Găgăuzia a participat la următoarele evenimente:

- Participarea la instruire «Coordonarea eficientă a achizițiilor TIC în instituțiile publice»;
- Participarea la Sesiuni de informare dedicate celui de-al doilea apel de proiecte cu valoare mică, lansat în cadrul programului Interreg-Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027;
- Participarea la sesiune de informare URBACT, în format online- Prezentarea apelurilor și Cum să construiești un parteneriat solid»;
- Participarea la sesiune de informare URBACT, în format online- Sesiune informativă online: Schimb de cunoștințe și învățare în rețea;
- Participarea la sesiunea de instruire „1st Advisory Mission in Chișinău”;
- Completarea formularul de Exprimare a Interesului în cadrul programului URBACT IV, pentru participarea la Rețelele de Transfer.

De asemenea, în perioada de raportare, ADR UTA Găgăuzia a fost cooptată în calitate de partener pentru a participa la programul - URBACT IV, pentru participarea la Rețelele de Transfer. A fost completat formularul de Exprimare a Interesului în cadrul programului URBACT IV, pentru participarea la Rețelele de Transfer și au fost remise partenerilor toate documentele necesare.

În scopul consolidării cunoștințelor și abilităților membrilor Grupului de lucru pe Capitolul 22 ”Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, Cancelaria de Stat, cu suportul Comisiei Europene, a organizat un atelier de instruire structurat în 2 sesiuni – (i) viitorul politicii de coeziune și principii orizontale de aplicare și (ii) clarificări, întrebări pentru pregătirea de screening bilateral (chestionarul și prezentări). Specialiștii ADR UTA Găgăuzia au participat la atelierul de lucru respectiv.

În cadrul Proiectului Ministerului Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale „*Sprijin pentru administrația publică din Republica Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană în domeniul gestionării fondurilor europene – continuare*”, și în contextul recomandărilor incluse în Raportul de Extindere pentru Capitolul 22, precum și al acțiunilor prevăzute în Planul Național de Acțiuni, Ministerului Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale

Obiectivul Specific 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială.

RD UTA Găgăuzia nu este o regiune omogenă, iar principalele problemele de coeziune teritorială sunt datorate disparităților care există între mediul urban și cel rural. De evoluții pozitive nu beneficiază în egală măsură toate localitățile și toate categoriile de populație în regiune. Decalaje semnificative între mediul urban și cel rural se înregistrează în materie de investiții, productivitate, ocupare, infrastructură, demografie și alte limitări și constrângeri de ordin social. O pondere semnificativă a forței de muncă în localitățile rurale este concentrată în sectoare cu productivitate scăzută cu un nivel relativ mic al salariilor, ceea ce are un impact negativ asupra coeziunii sociale.

De asemenea o problemă a dezvoltării sistemului de localități urbane și rurale în RD UTA Găgăuzia este capacitatea administrativă și financiară scăzută a autorităților publice locale de a genera și implementa politici locale eficiente de dezvoltare.

În acest context, elementul cheie al acestui obiectiv îl constituie creșterea coeziunii teritoriale și diminuarea disparităților între-regionale prin dezvoltarea echilibrată a zonelor urbane și rurale.

Accentul va fi pus pe sprijinirea și asigurarea accesului populației la servicii publice calitative prin dezvoltarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, reciclarea și valorificarea deșeurilor; pe promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă, sporirea eficienței energetice.

Principalele eforturi în vederea creșterii coeziunii teritoriale vor viza îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, precum și măsuri de adaptare a regiunii la schimbările climatice.

Măsura 2.1: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Una dintre direcțiile din cadrul acestei măsuri este îmbunătățirea infrastructurii și extinderea acoperirii sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității și eficienței acestor servicii. Implementarea acestei măsuri ar trebui să urmeze abordarea în etape stabilite de “Strategia națională sectorială de alimentare cu apă și canalizare 2014-2028”.

În Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia există o situație favorabilă în ceea ce privește accesul populației la serviciile de alimentare cu apă. Toate localitățile din regiune (26 de localități) au sisteme centralizate de alimentare cu apă, iar acest indicator este de 65,6% în întreaga țară (la situația din 2024). În special, conform datelor BNS (din 2024), numărul de locuințe este de 51,3 mii, dintre care 22,4 mii locuințe în mediul urban și 28,9 mii locuințe în mediul rural. Numărul gospodăriilor conectate la sistemul de alimentare cu apă este de 37,3 mii, dintre care 15,6 mii de locuințe în zonele urbane și 21,7 mii de locuințe în zonele rurale. Procentul localităților din UTA Găgăuzia care au acces la sistemele de alimentare publică cu apă este de 84,4%.

Nivelul de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare este semnificativ mai scăzut comparativ cu sistemele de alimentare cu apă. Astfel, conform BNS (din 2024), doar 10 localități din regiune (38,5%) au sistem de canalizare centralizat, dintre care 3 localități urbane și 7 localități rurale (100% localități urbane și 30,4% localități rurale). Numărul de locuințe racordate la sistemul de canalizare în anul 2024 este de 11,2 mii locuințe, sau 21,8% din fondul de locuințe al regiunii, dintre care 10,2 mii locuințe sunt în mediul urban și 1,00 mii locuințe sunt în mediul rural.

Pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a sectorului AAC în regiune, ADR UTAG în perioada anului 2025 a implementat 1 proiect cu impact regional din sursele FNDRL.

Tabelul 3. Proiecte în domeniul AAC finanțate din sursele FNDRL

Nr.	Denumirea proiectului	Cost total al proiectului Contractat, (mii. lei)	Suma solicitată din sursele FNDRL, în anul 2025 (mii. lei)	Cofinanțarea beneficiarului, (mii. lei)	Statutul proiectului
1	"Construcția rețelelor de canalizare în cartierul Zaialpujie din mun. Comrat"	4 695,3	2 230,804	0,0	Finalizat

Sursa: ADR UTA Găgăuzia

În perioada de referință, au fost implementate două proiecte majore ce vizează extinderea rețelelor de canalizare în municipiul Comrat.

1. Proiectul „Extinderea rețelelor urbane de canalizare în cartierul „Tanc””

Acest proiect a fost implementat integral. Costul total: 9 307,67 mii lei.

Rezultate obținute:

- Construcția a **7,7 km** de rețele de canalizare gravitaționale.
- Construcția a **1,2 km** de rețele de canalizare sub presiune.
- Instalarea unei stații de pompare cu o capacitate de 34 m³/24h.

Stadiul final: Lucrările de construcție au fost finalizate în anul 2024. În anul 2025 a avut loc recepția finală a lucrărilor, iar costurile investiționale au fost pregătite și transmise integral beneficiarului – Primăria municipiului Comrat.

2. Proiectul „Construcția rețelelor de canalizare în cartierul Zayalpujie”

Acest proiect a fost implementat integral. Costul total: 4 695,3 mii lei.

- **Rezultate obținute:** Rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 4,7 km.
- **Activități recente (2025):** Au fost desfășurate 3 ședințe de lucru și 5 vizite pe șantier pentru monitorizarea progresului.
- **Stadiul administrativ:** La sfârșitul lunii iunie 2025, a fost primit avizul pozitiv din partea Agenției Achiziții Publice pentru un acord adițional, care permite substituirea unor lucrări.
- **Situația financiară și data finalizării:** proiectul a fost finalizat și toate fondurile planificate au fost plătite. Cheltuielile financiare au fost transferate beneficiarului.

Problematica dezvoltării sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare rămâne o prioritate strategică pentru regiunea UTA Găgăuzia. În acest context, cel mai important proiect este construcția stației de epurare din municipiul Comrat, implementat în cadrul proiectului național „**Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova**”, finanțat de Banca Mondială prin Acordul de finanțare ratificat de Guvernul RM la 1 iunie 2021.

Pentru regiunea UTA Găgăuzia, proiectul vizează două măsuri investiționale majore.

1. Măsura investițională: Construcția stației de epurare a apelor uzate și extinderea sistemului de canalizare în mun. Comrat

Subproiectul: „Construcția stației de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de canalizare în municipiul Comrat”

În cadrul proiectului național „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, activitățile planificate pentru municipiul Comrat au înregistrat următoarea evoluție:

- **Acțiuni realizate:** Grupul de lucru responsabil a organizat ședințele necesare pentru evaluarea și stabilirea finală a criteriilor tehnice de proiectare.
- **Lansarea procedurii:** În baza acestor criterii, a fost inițiată procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare a stației de epurare și a rețelelor aferente.
- **Statutul actual:** În prezent, procedura de achiziție pentru serviciile de proiectare a fost **suspendată** printr-o decizie procedurală a Băncii Mondiale.
- **Perspective:** Implementarea măsurii investiționale rămâne pe pauză până la primirea unor aprobări sau instrucțiuni ulterioare din partea partenerului de dezvoltare.

2. Măsura investițională: Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul și orașul Vulcănești

Subproiectul: „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Vulcănești”

În cadrul proiectului național „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale, subproiectul din orașul Vulcănești a înregistrat progrese semnificative în a doua jumătate a anului 2025:

- **Finalizarea achizițiilor:** În urma procedurilor de licitație și a ședințelor comisiei de evaluare, a fost desemnat operatorul economic câștigător pentru execuția lucrărilor de construcție.
- **Supravegherea tehnică:** A fost finalizat procesul de selecție și pentru serviciile de supraveghere tehnică, asigurând astfel controlul riguros al calității pe tot parcursul implementării.
- **Demararea execuției:** Lucrările propriu-zise de construcție au fost lansate oficial în cursul anului 2025, conform graficului de execuție stabilit.

- **Coordonare instituțională:** Pentru a asigura buna desfășurare a proiectului, au fost organizate ședințe de lucru la care au participat reprezentanții antreprenorului și ai supravegherii tehnice, fiind consolidate mecanismele de monitorizare și raportare.



Imaginea 19-20. Proiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul și orașul Vulcănești”.

În perioada de raportare au avut loc 2 ședințe comune cu participarea ADR, primăria mun. Comrat, reprezentanților ONDRL și a Unității de implementare a proiectului, în scopul programării acțiunilor de implementare a măsurilor de investiții, prevăzute pentru mun. Comrat în cadrul proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în RM”. De asemenea în cadrul ședințelor a fost discutat rolul ADR UTA Găgăuzia în procesul de implementare a măsurilor investiționale. De asemenea, au avut loc 2 ședințe de lucru la nivel local în cadrul proiectului cu reprezentanții Primăriei mun. Comrat și întreprinderea municipală prestatoare de servicii de alimentare cu apă și canalizare "Su Canal Comrat". Totodată, la data de **10.12.2025**, a avut loc ședința Comisiei Sectoriale Regionale (CSR) în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (AAC) a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia:

- A fost audiat raportul privind stadiul de implementare a proiectelor în UTA Găgăuzia.
- Au fost examinate și aprobate ideile de proiecte de perspectivă.

Au fost formulate recomandări pentru Consiliul Național de Amenajare a Teritoriului al RM în vederea lansării oficiale a noilor inițiative în sector.

În cadrul concursului organizat de MIDR pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, finanțat de BERD, BERD au oferit disponibilitatea băncii pentru acordarea sprijinului financiar pentru modernizarea infrastructurii de apă și sanitație. Scopul proiectului este de a instala sisteme moderne de purificare a apei Q-DROP Yellowstone, care purifică apa de la robinet conform standardelor de apă potabilă, cu o capacitate de aproximativ 500 de litri pe oră. Din RD UTA Găgăuzia a fost depusă o cerere de finanțare.

La 20.08.2025 a avut loc o reuniune online în cadrul proiectului „Alimentarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova (BOSAQ)”, derulat pe baza unui acord interguvernamental semnat cu Regatul Belgiei, destinat autorităților locale de nivel I. Studiarea documentului „Regulament privind selectarea comunităților beneficiare Bosaq” și prezentarea propunerilor și modificărilor la acesta. A fost organizată o sesiune informativă privind lansarea unei competiții naționale pentru identificarea,

evaluarea și selectarea comunităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”. La eveniment au participat 21 de participanți.

Este important de menționat despre participarea la atelierul de lucru - un dialog cu privire soluții reale pentru comunități – de la provocări la bune practici în sectorul AAC în cadrul Programul UE4Moldova: Comunități Locale, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, eveniment organizat cu suportul GIZ Moldova.

O altă direcție în cadrul acestei măsuri include proiecte care vizează îmbunătățirea eficienței gestionării deșeurilor solide municipale prin dezvoltarea infrastructurii MDS, crearea unui sistem eficient de management prin cooperare intercomunală, practica promovării colectării selective a deșeurilor și îmbunătățirea calității și eficienței. a operatorilor regionali. Ca platformă pentru inițiativele planificate este „Strategia de management al deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027”.

Potrivit datelor statistice furnizate de BNS, în anul 2021 în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, 22 din 26 de localități vor utiliza servicii de îndepărtare a deșeurilor solide (inclusiv 3 localități urbane și 19 localități rurale). Numărul localităților care beneficiază de acest serviciu este în creștere față de anul de bază 2015, când doar 9 localități (3 urbane și 6 rurale) aveau servicii de colectare a deșeurilor. În ceea ce privește numărul de locuințe din UTA Găgăuzia care utilizează servicii de îndepărtare a deșeurilor solide, conform datelor statistice (2021) - 35,3 mii locuințe, sau 69% din totalul locuințelor din regiune, inclusiv: 19,9 mii locuințe din mediul urban 15,4 mii locuințe în mediul rural.

În perioada de raportare ADR nu a implementat proiecte în domeniul gestionării deșeurilor solide. Activitățile au fost orientate preponderent spre monitorizarea rezultatelor și a sustenabilității proiectului *”Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești”* implementarea căruia a fost finalizată în anul 2021.

Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri în regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Activitățile principale în cadrul măsurii respective sunt axate pe dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea afacerilor și creșterea gamei de servicii oferite. Prioritare în cadrul acestei măsuri sunt acțiunile de sprijinire a consolidării și modernizării infrastructurii existente de sprijinire a afacerilor prin diversificarea gamei de servicii oferite pentru a răspunde nevoilor antreprenorilor. În regiune, este necesar să se maximizeze potențialul ZEL „Valkaneș” (inclusiv subzone), a incubatorului de afaceri din mun. Ceadâr-Lunga, incubatorului de inovare „Inno Center” și altele.

În POR UTA Găgăuzia 2022-2024 sunt stabiliți principalii indicatori care urmează a fi atinși în cadrul măsurii 2.2. Aceștia sunt:

- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în regiunea UTA Găgăuzia cu aproximativ 2% până în 2024
- Creșterea nivelului salariilor medii în regiunea UTA Găgăuzia până la circa 85% din nivelul mediu pe țară până în 2024
- Creșterea nivelului de dotare a orașelor - centre raionale cu platforme economice echipate cu toate serviciile publice pentru a sprijini investițiile și a crea locuri de muncă în zonele rurale din apropiere.

Conform BNS, ocuparea forței de muncă în regiune în 2024 este de 34,8% (Regiunea de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia). Salariul mediu anului 2025 este de 10 775,6 lei, sau 69,6% față de nivelul național, care constituie 15 487,8.

În perioada de raportare, în cadrul Măsurii 2.2: *”Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia”* în curs de implementare se află 1 proiect de dezvoltare regională *”Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și din regiune”*.

Stadiul actual al proiectului „Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și din regiune”.

După actualizarea documentației tehnice și semnarea contractului de antrepriză cu compania S.A. „Colass” în noiembrie 2024, execuția lucrărilor a avansat semnificativ pe parcursul anului 2025.

Principalele etape realizate la finalul anului 2025:

- **Valorificare financiară:** Până în prezent, au fost executate și achitate lucrări în valoare de **20 955 660 lei** din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
- **Infrastructura de bază:** Au fost finalizate lucrările de terasament, excavarea completă a gropii de fundație (100m x 60m), compactarea solului și realizarea planificării verticale a terenului.
- **Structura de rezistență:** S-a finalizat turnarea fundațiilor pahar din beton armat și, ulterior, a fost executată turnarea pardoselilor interioare ale clădirii.
- **Asamblarea metalică:** Carcasa clădirii este complet asamblată, fiind finalizat montajul coloanelor și al fermelor metalice de compartimentare și acoperiș.
- **Închideri perimetrale:** A fost inițiat procesul de montare a panourilor termoizolante de tip sándwich pentru pereții exteriori, acestea fiind instalate parțial pe suprafața structurii.

Statutul actual: În prezent, lucrările sunt suspendate pentru perioada de iarnă, fiind semnat un acord adițional de prelungire a contractului din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Proiectul se află în graficul de execuție pentru a asigura crearea celor **5 200 m²** de spații de producție, darea în exploatare fiind planificată pentru **semestrul I al anului 2026**.



Imagina 21-22. Proiectul "Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și din regiune"

Obiectivul Specific 3: Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii Naționale de Dezvoltare Regională.

Această sarcină specifică are ca scop îmbunătățirea managementului procesului de implementare, care se află încă într-un stadiu tranzitoriu de dezvoltare și consolidare. Implementarea politicii de dezvoltare regională este susținută atât prin intermediul programelor și fondurilor naționale, precum și cele oferite de donatorii și parteneri de dezvoltare. În acest sens, măsurile necesare pentru îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare, implementare și evaluare a politicii naționale de dezvoltare regională ar trebui realizate la mai multe niveluri. În același timp, scopul este nu numai consolidarea mecanismelor și instrumentelor existente, ci și crearea altora noi menite să asigure aplicarea practică a abordării intersectoriale a politicii de dezvoltare regională, inclusiv aprofundarea cooperării între toți participanții la procesul de implementare.

În acest sens acțiunile au fost orientate spre:

- Sprijinirea îmbunătățirii cadrului instituțional al politicii de dezvoltare regională ;
- Consolidarea capacităților tuturor actorilor regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională.

Măsura 3.1: Sporirea eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională.

Scopul acestei măsuri constă în eficientizarea procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională. În acest sens, au fost întreprinse acțiuni pe 2 măsuri majore:

1. Sprijinirea îmbunătățirii cadrului instituțional al politicii de dezvoltare regională. Activitățile realizate la această măsură au fost axate pe procesul de regionalizare și promovare a obiectivelor de sporire a competitivității regionale și dezvoltarea cadrului instituțional. Totodată, cu participarea ADR UTA Găgăuzia, în cadrul normativ și legislativ au fost operate modificări și ajustări în acest sens, pentru a face posibilă dezvoltarea ascendentă a regiunii. Au fost elaborate ajustări și completări la Programul național de dezvoltare a orașelor poli creștere în Republica Moldova pentru 2021-2027 și participarea în proces de raport de evaluare intermediară a implementării programului național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere.

În contextul obținerii statutului de țară candidată la UE a Republicii Moldova, ADR UTAG s-a implicat activ la completarea două chestionari privind progresele înregistrate între 1 septembrie 2024 și 31 martie 2025, în conformitate cu Instrucțiunea 1/2025 privind metodologia de elaborare și prezentare a contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere 2025.

În scopul consolidării cunoștințelor și abilităților membrilor Grupului de lucru pe Capitolul 22 ”Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, Cancelaria de Stat, cu suportul Comisiei Europene, a organizat un atelier de instruire structurat în 2 sesiuni – (i) viitorul politicii de coeziune și principii orizontale de aplicare și (ii) clarificări, întrebări pentru pregătirea de screening bilateral (chestionarul și prezentări)

2. Facilitarea desfășurării la nivel regional a concursului de propuneri de proiecte din FNDRL :

În mod continuu, la cererea primăriilor din regiune, li s-a oferit consultări offline și online cu privire la completarea cererilor de finanțare, precum și cu privire la documentele necesare pentru depunerea cererilor.

În perioada de raportare au fost oferite consultări cu privire la problemele apărute în procesul de depunere a propunerilor de proiecte pentru concursul de proiecte regionale. În cadrul a 2 concursuri: Concurs de proiecte pentru orașele și satele Republicii Moldova (ediție specială FNDRL) din 03.04.2025 și Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul sporii atractivității turistice- apel pe lista din 20.06.2025 au fost depuse 5 concepte de proiecte. De asemenea, în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională (ediția-2024) au fost depuse 6 cereri de finanțare. În perioada de raportare au fost anunțate 4 concursuri pentru propuneri de proiecte din fondurile FNDRL, pentru două dintre acestea solicitantul a fost ADR și, în urma cărora, au fost depuse 5 note conceptuale.

În plus, în iunie, a fost finalizat concursul pentru depunerea cererilor de finanțare, în urma căruia APL din regiune au depus 6 cereri de finanțare. Comisia de evaluare a efectuat evaluarea.

La data 14.03.2025 -a fost organizat unui seminar de informare pentru APL în cadrul cererilor candidaților pentru proiectele regionale finanțate de FNDRL care au ajuns la etapa a doua a competiției. La evenimentul menționat au fost prezenți 11 de reprezentanți ai APL din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.



Imaginea 23-24. Sesiune de informare pentru primarii din Regiunea UTA Găgăuzia

Reprezentanților centrelor urbane din regiunea de dezvoltare UTA Gagauzia li s-au oferit în mod constant consultanță cu privire la revitalizarea urbană, precum și la propunerile de proiecte ale orașelor.

Participarea la ședințele grupului de lucru privind dezvoltarea urbană integrată (în cadrul proiectului GIZ Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Moldova) al mun.Comrat:

03.04.2025 – Ședința grupului de lucru. Subiect: Prezentarea și discutarea versiunii preliminare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea serviciilor de transport public în municipiul Comrat.

29.05.2025 - Consultări publice în cadrul procesului de elaborare a studiului de fezabilitate tehnico-economică privind modernizarea transportului public în municipiul Comrat.

Participarea la:

20.02.2025 - Ședință de lucru a fost organizată în cadrul inițiativei de elaborare a unui plan de adaptare la schimbările climatice și reducere a riscului de dezastre naturale al mun. Comrat.

25.06.2025 – Ședința grupului de lucru. Subiect: Prezentarea versiunii preliminare a PUGM. Analiza situației actuale, Viziune și Obiective, Modelare transport și evaluare scenarii, prezentare generală a proiectelor (măsurilor) cheie propuse în cadrul PUGM.

- Oferirea consultațiilor permanente către APL din regiune privind completarea cererilor de finanțare, precum și privind documentele necesare pentru depunerea conceptelor și cererilor de finanțare.
- Comisia de evaluare a notelor conceptuale și a cererilor de finanțare la nivel regional în cadrul selectării proiectelor de dezvoltare regională prin concurs(2024), care au fost create prin ordinul directorului ADR UTA Găgăuzia №02-02/13-24 din 06.08.2024.
- La **21.07.2025** a fost efectuată evaluarea administrativă, iar la **28.07.2025** – evaluarea tehnică. Toate cele 6 cereri de proiect au fost aprobate și transmise Comisiei Interministeriale pentru includerea în DUP. Prin Decizia CNCDDL nr. 65 din 26.09.2025, aceste 6 proiecte au fost aprobate pentru finanțare ulterioară.

În plus, 5 note conceptuale au fost depuse de agenție în cadrul a 2 concursuri pe listă anunțate de MIDR.

În cadrul concursului organizat de MIDR pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, finanțat de BERD, BERD au oferit disponibilitatea băncii pentru acordarea sprijinului financiar pentru modernizarea infrastructurii de apă și sanitație. Scopul proiectului este de a instala sisteme moderne de purificare a apei Q-DROP Yellowstone, care purifică apa de la robinet conform standardelor de apă potabilă, cu o capacitate de aproximativ 500 de litri pe oră. A fost o cerere de finanțare.

În vederea realizării măsurii respective, în perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a conlucrat cu MIDR, partenerii de dezvoltare și autoritățile din regiune pentru a continua procesul de sporire a eficienței instituțiilor de dezvoltare regională. Activitățile de dezvoltare a eficienței instituțiilor de dezvoltare regională au fost ghidate de *Programul de instruire în domeniul dezvoltării regionale 2025* document care stabilește domeniile și modulele de instruire planificate. Reprezentanții din ADR UTA Găgăuzia au participat în ciclul de instruire destinate consolidării capacităților instituțiilor responsabile de implementare a politicii de dezvoltare regională și locală. Proiectul este desfășurat în cadrul programului „Implementarea programului de consolidare a capacităților instituțiilor publice responsabile de politica de dezvoltare regională și locală în contextul statutului de țară candidată la UE al Republicii Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul proiectului EU4MR, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Institutul de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia. Ciclul de instruire a inclus 5 module. Ciclul de formare a inclus 5 module cu durata de 1-2 zile fiecare:

Bloc 0: Introducere - înțelegerea fundamentală a abordării UE privind politica regională și dezvoltarea durabilă;

Bloc 1: Programarea și planificarea dezvoltării regionale;

Block 2: Finanțarea politicii regionale;

Block 3: Monitorizarea și evaluarea în cadrul politicii regionale a UE;

Block 4: Managementul proiectelor.

11-12.03.2025 – Participare la trainingul „Leadership Inovator”, în cadrul Proiectului „Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Moldova” SBS/ GIZ.

O sarcină importantă a ADR constă în asigurarea mecanismelor și metodelor de implicare în procesul de dezvoltare regională. În acest context un rol important îl are Consiliul Regional pentru Dezvoltare care constituie o platformă pentru identificarea priorităților de dezvoltare și luare a deciziilor la nivel regional.

În perioada de raportare, Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia a asigurat activitatea Secretariatului Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) UTA Găgăuzia

În perioada de raportare, a fost organizată 2 ședințe a CRD, în cadrul căreia au fost adoptate 8 decizii.

La 27 februarie 2025, a fost organizată o ședință a Consiliului Regional pentru dezvoltarea UTA Găgăuzia, la care a fost prezent Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale al RM.

În cadrul acestei reuniuni, au fost discutate și s-au luat decizii cu privire la următoarele aspecte-cheie:

- a fost aprobat Raportul privind punerea în aplicare a „Programului Operațional Regional al UAT Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia pentru 2022-2024” pentru 2024;

- a fost aprobată prelungirea „Programului Operațional Regional /ROP/ al regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru 2022-2024” pentru 2025;

- a fost aprobat Planul de implementare a „POR al regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru 2022-2024” pentru 2025;
- a fost prezentată informația curentă privind implementarea proiectelor regionale ale regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia, finanțate din FNDRM, incluse în Documentul Unic de Program pentru 2025-2027
- au fost prezentate rezultatele evaluării notelor conceptuale depuse în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională în 2024;
- a fost aprobat documentul „Studiu de specializare intelectuală pentru regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia din Republica Moldova”;

La 28 iulie 2025, Consiliul Regional pentru Dezvoltarea UTA Găgăuzia a avut loc o ședință ordinară. Ședința a avut loc online, cu participarea ministerului de resort, reprezentat de Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În cadrul ședinței, au fost luate decizii cu privire la următoarele aspecte cheie:

- A fost aprobat raportul privind implementarea Programului Operațional Regional pentru Dezvoltarea UTA Găgăuzia pentru perioada 2022–2024/2025 pentru semestrul I anului 2025.
- A fost aprobată lista cererilor de proiecte selectate pe baza rezultatelor Apelului de propuneri, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Rata de participare a membrilor CRD în procesele decizionale în perioada de raportare a constituit 70%.



Imaginea 25, 26. Ședința Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia

La 10 decembrie 2025, a avut loc o ședință a Comisiei Regionale Sectoriale pentru Dezvoltarea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. În cadrul ședinței, a fost discutată situația actuală din sector, inclusiv inițiativele în curs și perspectivele de dezvoltare. Pe baza discuțiilor, au fost elaborate recomandări și propuneri pentru Consiliul Național pentru Dezvoltarea Teritoriilor Republicii Moldova privind inițierea unor proiecte majore de alimentare cu apă și sanitație în regiune.

În perioada de raportare, respectiv la data de 29 mai 2025, a fost organizată prima ședință a grupului de lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional al UTA Găgăuzia pentru perioada 2026 - 2028, în cadrul căreia a fost prezentată componența grupului de lucru, precum și a fost audiat „Raportul privind implementarea Programului Operațional Regional al Regiunii de Dezvoltare UAT Găgăuzia pentru perioada 2022 - 2024”. De asemenea, în cadrul întâlnirii, grupul de lucru a analizat aspecte privind Abordarea metodologică pentru elaborarea Programului Operațional Regional 2026 -

2028, structura și viziunea strategică și prioritățile specifice ale Programului Operațional Regional 2026 - 2028.

Acest document este foarte important pentru regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, deoarece Programul Operațional Regional este principalul document de programare la nivel regional, care asigură coerența măsurilor planificate la nivel regional cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR). Astfel, se formează un document la nivel regional, care reflectă obiectivele, acțiunile și proiectele planificate pentru următorii 3 ani, precum și măsurile și prioritățile, în funcție de nevoile de dezvoltare ale regiunii. Programul Operațional nu este doar un plan pe hârtie, ci un instrument cheie care va determina direcțiile de investiții și proiecte pe baza nevoilor reale ale teritoriilor, a priorităților economice și a potențialului comunităților locale.



Imaginea 27, 28. Ședință a grupului de lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional al UTA Găgăuzia

În perioada de raportare au fost desfășurate un șir de activități de instruire care au contribuit la dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională. Printre cele mai semnificative rezultate obținute în procesul de dezvoltare a capacităților sunt următoarele:

Sesiuni de instruire organizate:

14.03.2025. Sesiune de informare privind completarea cererilor de finanțare în cadrul Concursului pentru selectarea proiectelor de dezvoltare regională în anul 2024.

09.09.2025. Dezvoltarea potențialului de cooperare cu Uniunea Europeană: proiecte de sprijinire a dezvoltării autorităților locale, programul de asistență tehnică „Impact UTA Gagauzia”.

16.10.2025. Sesiunea informativă cu privire Apelului III de propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunărea 2021-2027.

20.10.2025. Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: Introducere în managementul proiectelor și Planificarea strategică în proiecte.

21.10.2025. Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: Prezentare generală a implementării și controlului proiectului;

22.10.2025. Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: Bazele monitorizării și evaluării proiectelor și analiza riscurilor potențiale;

24.12.2025. IMPACT Gagauzia: prezentarea finală a ideilor de proiect. Consolidarea potențialului proiectelor de cooperare ale Uniunii Europene în vederea sprijinirii dezvoltării autorităților locale.

Participări la atele instruirii:

21.01.2025-23.01.2025. Training «Experiential learning methods and tools for competence in green tourism»;

28.01.2025. Masă rotundă - ”Reziliența macroeconomică a Republicii Moldova în contextul amenințărilor la adresa securității regionale și globale;

06.02.2025-07.02.2025. Bloc 0: Grupa A, Grupa B. Introducere - înțelegerea fundamentală a abordării UE privind politica regională și dezvoltarea durabilă;

10.02.2025-14.02.2025. Online training sessions for the project preparation. «Go for Cooperation Weeks» TESIM;

10.02.2025. Bloc 1: Programarea și planificarea dezvoltării regionale;

05.03.2025-06.03.2025. Block 2: Finanțarea politicii regionale;

10.03.2025-11.03.2025. Block 3: Monitorizarea și evaluarea în cadrul politicii regionale a UE;

11.03.2025. Sesiune de instruire, organizată în cadrul proiectului «Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova»;

13.03.2025. Block 4: Managementul proiectelor;

07.04.2025-12.04.2025 Vizită de studiu în Polonia

29.04.2025. Sesiune online cu genericul «Capitala Sportului»;

05.05.2025. Sesiune de informare dedicată Apelului pentru Rețele de Transfer URBACT IV;

14.05.2025. Training session on EU Cohesion Policy and Chapter 22 for the authorities of the Republic of Moldova;

21.05.2025. Webinar- Coordonarea eficientă a achizițiilor TIC în instituțiile publice;

27.05.2025, 03.06.2025. Sesiune de informare dedicate celui de-al doilea apel de proiecte cu valoare mică, lansat în cadrul programului Interreg-Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027;

05.06.2025. Sesiune de informare FACEM Investiții Sustenabile BGK, produs de finanțare nou lansat;

08.06.2025-14.06.2025. Vizită de studiu în Republica Cehia;

25.06.2025. Sesiune de consultare privind implementarea sistemului de achiziții publice centralizate;

26.06.2025. Business seminar Team Poland for the EU Moldova Growth Plan.

01.07.2025. Initial training on programme cycle management under Cohesion Policy. GL-22

17.07.2025. Dialog strategic privind implementarea Programului Național de Specializare Inteligentă- «Smart Moldova».

23.07.2025-29.07.2025. Instruire pentru Autoritățile Publice Locale (APL) în dezvoltare și managementul integrat al proiectelor. Traininguri pentru formatori

26.08.2025-10.09.2025. Traininguri pentru formatori. Mentoring session.

18.09.2025. Sesiunea de instruire: «Specializare inteligentă. Strategii pentru dezvoltarea economică locală și regională».

22.09.2025-24.09.2025. 2nd Advisory mission in Chișinău

08.10.2025-15.10.2025. Sesiunea informativă cu privire la Apelul III de propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunărea 2021-2027

28.10.2025. Sesiune de formare dedicată diagnosticării și identificării zonelor degradate, precum și participării publice la procesul de revitalizare

06.11.2025. Coordinating and communicating on EU cohesion funds: experience sharing workshop. GL-22

17.11.2025. Interreg Programmes 2021-2027 with Poland participation. Control and audit. Financial management

28.11.2025. Instruire cu tematica : «Aplicarea legislației privind accesul la informațiile de interes public»

03.12.2025-04.12.2025. Training for OMPU on the Urban Revitalization Program

18.12.2025. Cursul de instruire în domeniul raporturilor de muncă

Conferințe, forumuri participante:

11.02.2025. Conferința Științifico-Practică Internațională dedicată aniversării 34-a înființării Universității de Stat din Comrat;

02.06.2025. Conferință online dedicată relațiilor de muncă în întreprinderi și instituții.

09.09.2025 - a avut loc lansarea proiectului IMPACT UTA Găgăuzia, implementat de Centrul de Dezvoltare Internațională al Estoniei (ESTDEV) în parteneriat cu Civitta și Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia. Inițiativa are drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale, mediului de afaceri, societății civile și mediului academic din Găgăuzia pentru pregătirea și implementarea proiectelor conform standardelor Uniunii Europene. În cadrul lansării proiectului IMPACT UTA Găgăuzia, implementat de ADR UTA Găgăuzia în colaborare cu ESTDEV, au participat secretarii de stat al Guvernului Estoniei, 97 de participanți din RDG Găgăuzia și r-lui Taraclia, care au elaborat 9 concepte de proiecte.

07.11.2025 - Organizarea Forumului privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor”, mun.Comrat. La eveniment au participat 60 de reprezentanți ai autorităților locale, ministerelor, instituțiilor de învățământ și altor organizații.

19.11.2025. Forumul regional din Comrat „Parteneriate locale pentru integrarea europeană”

27.11.2025. Conferința «Orașe Intelegente-Viitorul Urban al Regiunilor»

11.12.2025. Conferința națională științifico-practică „Probleme și provocări ale economiei regionale în contextul globalizării”

24.12.2025 - în mun. Comrat, s-a desfășurat evenimentul de totalizare a programului de asistență tehnică — „IMPACT Găgăuzia: Final Project Pitch & Development Lab”.

Evenimentul a marcat finalizarea programului IMPACT UTA Găgăuzia, finanțat de Guvernul Estoniei prin intermediul agenției ESTDEV, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.



Imaginea 29, 30. Forum „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor”, mun.Comrat.

Informații suplimentare despre activitățile de formare desfășurate în perioada de raportare sunt disponibile în Anexa 3 la prezentul Raport anual.

În perioada de raportare a continuat procesul de evaluare a impactului proiectelor implementate de către ADR UTA Găgăuzia. În cadrul secției de monitorizare și evaluare au fost elaborate 5 rapoarte de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională pentru următoarele proiecte:

- „Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin aplicarea formelor hibride de educație”;
- ”Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare”.
- ”Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate mun. Comrat”.
- Amenajarea și conectarea la infrastructura comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat.
- Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești.

Măsura 3.2: Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională.

În perioada de raportare au fost realizate un șir de activități relevante pentru măsura respectivă. Printre cele mai relevante activități pot fi menționate următoarele:

- În perioada de raportare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat Concursul de propuneri de proiecte Concurs de proiecte pentru orașele și satele Republicii Moldova (ediție specială FNDRL) din 03.04.2025 și Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul sporii atractivității turistice- apel pe lista din 20.06.2025 au fost depuse 5 concepte de proiecte. De asemenea, în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională (ediția-2024) au fost depuse 6 cereri de finanțare, care au fost evaluate.
- În perioada de raportare au fost anunțate 4 concursuri pentru propuneri de proiecte din fondurile FNDRL, pentru două dintre acestea solicitantul a fost ADR și, în urma cărora, au fost depuse 5 note conceptuale. În plus, în iunie, a fost finalizat concursul pentru depunerea cererilor de finanțare, în urma căruia APL din regiune au depus 6 cereri de finanțare. Comisia de evaluare a efectuat evaluarea administrativă a proiectelor depuse. În trimestrul următor, va fi efectuată și evaluarea tehnică a cererilor depuse.
- Participare la elaborarea Conceptului de instruire pentru autoritățile publice locale (APL) din Republica Moldova în domeniul dezvoltării integrate și managementului proiectelor.
- Participarea la ședința de fondare a Consiliului Sectorial de Asistență Externă în Sectorul Dezvoltare Regională și Locală, această platformă oferă o oportunitate unică de colaborare și coordonare a principalelor părți interesate care lucrează în domeniul dezvoltării regionale și locale, inclusiv a donatorilor și partenerilor externi, precum și o oportunitate de a discuta strategii și bune practici.
- Ca membru al grupului GL-22 participat la un șir de ateliere de lucru dedicate schimbului de bune practici. În perioada de raportare, au fost completate două chestionare privind progresele înregistrate între 1 septembrie 2024 și 31 martie 2025, în conformitate cu Instrucțiunea 1/2025 privind metodologia de elaborare și prezentare a contribuției Republicii Moldova la Pachetul de extindere 2025.
- La data 14-15.05.2025 în scopul consolidării cunoștințelor și abilităților membrilor Grupului de lucru pe Capitolul 22 ”Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, Cancelaria de Stat, cu suportul Comisiei Europene, a organizat un atelier de instruire structurat în 2 sesiuni – (i) viitorul politicii de coeziune și principii orizontale de aplicare și (ii) clarificări, întrebări pentru pregătirea de screening bilateral (chestionarul și prezentări).
- Totodată participat la vizită de studiu în cadrul proiectului «Suport pentru administrația publică din Moldova în procesul de aderare în UE domeniul gestionării fondurilor europene», Polonia.



Imagina 31, 32. Vizită delegației RM în Polonia.

- 03.10.2025 - instruire privind modul de gestionare a proiectelor planificate în Planul Național de Dezvoltare (PND) și Lista indicativă a proiectelor investiționale pentru implementarea Planului de Creștere al Republicii Moldova (SIP), precum și utilizarea Sistemului Informațional project. gov.md.

- 16.10.2025 – A fost organizată o sesiune informativă privind lansarea unei competiții naționale pentru identificarea, evaluarea și selectarea comunităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”. La eveniment au participat 21 de participanți.

- 14.12.2025 – În cadrul concursului organizat de MIDR pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, finanțat de BERD, BERD au oferit disponibilitatea băncii pentru acordarea sprijinului financiar pentru modernizarea infrastructurii de apă și sanitație. Scopul proiectului este de a instala sisteme moderne de purificare a apei Q-DROP Yellowstone, care purifică apa de la robinet conform standardelor de apă potabilă, cu o capacitate de aproximativ 500 de litri pe oră. A fost o cerere de finanțare.

În cadrul realizării obiectivelor de sprijinire a autorităților administrației publice locale în accesarea surselor externe de finanțare, în perioada de raportare a fost desfășurată o activitate intensă de monitorizare a programelor disponibile, participare la evenimente de instruire, informare și consultare a primăriilor.

Toate cele 26 de primării au fost oficial informate despre concursurile și programele identificate, au primit materiale explicative privind condițiile de participare, termenele de depunere a cererilor, precum și asistență consultativă necesară pentru pregătirea dosarelor.

Participarea la activități de instruire

În scopul consolidării competențelor necesare pentru elaborarea și gestionarea proiectelor, în perioada **11–14 februarie și 3–6 martie 2025**, a fost asigurată participarea activă la instruirea online „Go for Cooperation”, organizată în cadrul programului **Interreg TESIM NEXT**.

Instruirea a fost axată pe dezvoltarea abilităților esențiale în domeniul cooperării transfrontaliere și al elaborării aplicațiilor de proiect. Sesiunile de instruire s-au desfășurat zilnic, cu o durată de câte 2 ore fiecare.

Tematica sesiunilor de instruire a inclus:

Ziua 1: Cum să valorifici la maximum cooperarea internațională și să identifici parteneri de încredere;

Ziua 2: Cum să elaborezi o propunere de proiect conform cerințelor unui apel de finanțare;

Ziua 3: Planificarea proiectului – cum să elaborezi un plan de acțiuni realist și coerent;

Ziua 4: Bugetarea – elaborarea planului financiar și a bugetului proiectului.

Participare în ciclului de instruire destinate consolidării capacităților instituțiilor responsabile de implementare a politicii de dezvoltare regională și locală. Proiectul este desfășurat în cadrul programului „Implementarea programului de consolidare a capacităților instituțiilor publice responsabile de politica de dezvoltare regională și locală în contextul statutului de țară candidată la UE al Republicii Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul proiectului EU4MR, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Institutul de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia. Ciclul de formare a inclus 5 module cu durată de 1-2 zile fiecare:

- Bloc 0: Introducere - înțelegerea fundamentală a abordării UE privind politica regională și dezvoltarea durabilă;
- Bloc 1: Programarea și planificarea dezvoltării regionale;
- Block 2: Finanțarea politicii regionale;
- Block 3: Monitorizarea și evaluarea în cadrul politicii regionale a UE;
- Block 4: Managementul proiectelor.

11-12.03.2025 – specialiștii ADR UTA Găgăuzia au participat la trainingul „Leadership Inovator”, în cadrul Proiectului „Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Moldova” SBS/ GIZ.

- În urma participării, au fost colectate materiale metodologice, care ulterior au fost distribuite primăriilor interesate. În cadrul monitorizării permanente a surselor de finanțare externe, APL-urile au fost informate despre următoarele apeluri relevante, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare teritorială și capacitatea de participare:

1. Al doilea apel pentru proiecte de mică amploare (Small Scale Projects)

- **Program:** Interreg NEXT VI-a România – Republica Moldova 2021–2027
- **Obiectiv:** Finanțarea proiectelor de dimensiuni reduse în domeniul turismului, culturii, dezvoltării locale și protecției mediului.
- Primăriilor le-au fost puse la dispoziție formulare de autoevaluare a capacității de participare și modele de propuneri de proiect.

2. Programul URBACT – Apel pentru participare în Rețelele de Transfer (Transfer Networks)

- **Obiectiv:** Schimb de bune practici între municipalitățile din Europa și Republica Moldova, transferul de soluții și inovații urbane testate.
- A fost oferită consultanță privind constituirea parteneriatelor și completarea formularelor de exprimare a interesului.

3. Programul național „Capitala Sportului”

- **Organizator:** Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
- **Obiectiv:** Susținerea inițiativelor de dezvoltare a infrastructurii sportive și organizarea activităților sportive la nivel local.
- A fost desfășurată muncă individuală de consultanță cu primăriile privind etapele de elaborare a cererii de finanțare, pregătirea documentației suport și estimarea bugetului, inclusiv prin participarea la instruire relevante.

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

Cooperarea cu proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Printre principalele rezultate ale colaborării cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei pot fi menționate următoarele:

- Colaborarea în cadrul proiectului GIZ ”Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova” (SBC). Reprezentanții ADR fac parte din grupurile de lucru create în cadrul proiectului:
- Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană integrată care are sarcina de a asigura un cadru participativ de luare a deciziilor privind proiectele de dezvoltare urbană prioritare, precum și de

a contribui la procesul de planificare a dezvoltării urbane. În perioada de raportare au avut loc 4 ședințe ale grupului de lucru privind dezvoltarea urbană integrată a mun. Comrat creat în cadrul proiectului GIZ/SBC.

- Grupul de lucru pentru dezvoltare economică locală - Scopul principal este de a crea bazele pentru îmbunătățirea condițiilor socio-economice în mun. Comrat prin: promovarea și implementarea unui set de măsuri de dezvoltare economică locală; susținerea contribuției sectorului privat la procesele și soluțiile mediului de afaceri al municipiului; sprijinirea implementării și îmbunătățirii serviciilor de afaceri pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici. În cadrul ședinței grupului de lucru au fost identificate un șir de concepte de proiecte de dezvoltare economică locală.
- Participare la evenimente la MIDR privind prezentarea unei noi platforme informațională finanțată din sursele GIZ;
- Cu sprijinul tehnic al GIZ, au fost elaborați termenii de referință pentru experți privind dezvoltarea cercetării privind specializarea inteligentă pentru regiunea Sud și UTA Găgăuzia. A fost publicat anunțul de participare prin care au fost selectați 2 experți individuali capabili să dezvolte cercetări privind specializarea inteligentă pentru regiunea de Sud și UTA Găgăuzia în cadrul proiectului „Întreprinderi și comunități puternice pentru Moldova”. Experții selectați au realizat toate activitățile planificate în conformitate cu prevederile Termenilor de referință
- 11-12.03.2025 – Participare la trainingul „Leadership Inovator”, în cadrul Proiectului „Întreprinderi și Comunități Puternice pentru Moldova” SBS/ GIZ.
- 08.06.2025-14.06.2025. Vizită de studiu în Republica Cehă;
- 25.06.2025 – Ședința grupului de lucru. Subiect: Prezentarea versiunii preliminare a PUGM. Analiza situației actuale, Viziune și Obiective, Modelare transport și evaluare scenarii, prezentare generală a proiectelor (măsurilor) cheie propuse în cadrul PUGM.
- Participarea la prezentarea și discutarea versiunii finale a Studiului de fezabilitate tehnico-economică privind modernizarea transportului public în municipiul Comrat;
- 24.07.2025 – ședința de consultări publice privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a mun. Comrat.
- 07.08.2025 - O ședința de lucru cu reprezentanții SF PL în contextul continuării activităților de pilotare a Conceptului de instruire pentru Autoritățile Publice Locale (APL) în dezvoltarea și managementul integrat al proiectelor, în vederea evaluării necesităților instituției privind dotarea cu echipament tehnic a unității responsabile de instruirea APL
- 18-19.09.2025 - Participare la trainingul, organizat de către GIZ, Specializarea inteligentă: Strategii pentru dezvoltarea economică locală și regională.
- 07.11.2025 - Cu sprijinul financiar GIZ a fost organizat Forumului privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor”, mun.Comrat. La eveniment au participat 60 de reprezentanți ai autorităților locale, ministerelor, instituțiilor de învățământ și altor organizații.
- 18.11.2025 – participarea la atelier de lucru - un dialog cu privire soluții reale pentru comunități – de la provocări la bune practici în sectorul AAC în cadrul Programul UE4Moldova: Comunități Locale, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijine GIZ.



Imaginea 33, 34. Cooperarea cu proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Cooperarea cu proiectul Băncii Mondiale ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

Stadiul actual de implementare a proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” în UTA Găgăuzia (situația la iulie 2025). În cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială, continuă activitățile pe două direcții-cheie pentru regiune:

- Subproiectul „Construcția stației de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de canalizare în municipiul Comrat”. Pe parcursul anului 2025, grupul de lucru a desfășurat două ședințe pentru evaluarea și aprobarea criteriilor tehnice. În baza acestora, a fost lansată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru stația de epurare. La momentul actual, această procedură este în plină desfășurare.
- Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul și orașul Vulcănești”.

În semestrul I a anului 2025, a avut loc o ședință de lucru importantă și a fost semnat un acord de colaborare între toate părțile implicate pentru a asigura o implementare eficientă.

- ✓ Activitățile au avansat semnificativ prin trecerea de la etapa de planificare la cea de execuție:
 - ✓ Lansarea lucrărilor Cahul-Vulcănești: În urma unei noi ședințe a comisiei de evaluare, a fost desemnat câștigătorul licitației pentru execuția lucrărilor în cadrul subproiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Cahul și orașul Vulcănești”.
 - ✓ Demararea execuției: Lucrările de construcție a conductei de aducțiune au fost lansate oficial, marcând o etapă critică în asigurarea securității apei pentru regiune.
 - ✓ Monitorizare și Supraveghere: A fost desemnat operatorul responsabil pentru serviciile de supraveghere tehnică, asigurându-se controlul calității pe tot parcursul procesului de construcție.
- Managementul proiectului: ADR UTA Găgăuzia a facilitat în total 5 ședințe de lucru pentru coordonarea măsurilor investiționale destinate municipiului Comrat și orașului Vulcănești. Implicare Instituțională: ADR UTA Găgăuzia a asigurat suportul tehnic și consultativ în toate etapele de colectare a datelor și consultare publică pentru aceste documente.

Cooperarea cu ”Solidarity Fund” (Polonia)

În perioada de raportare, cooperarea dintre ADR și SF PL s-a axat pe următoarele:

- Ședința de lucru - prezentarea activităților SF PL planificate pentru 2025 și posibilități de colaborare;
- Participare în ciclului de instruire destinate consolidării capacităților instituțiilor responsabile de implementare a politicii de dezvoltare regională și locală. Proiectul este desfășurat în cadrul

programului „Implementarea programului de consolidare a capacităților instituțiilor publice responsabile de politica de dezvoltare regională și locală în contextul statutului de țară candidată la UE al Republicii Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul proiectului EU4MR, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Institutul de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia. Ciclul de instruire a inclus 5 module. Ciclul de formare a inclus 5 module cu durata de 1-2 zile fiecare.

- 05.06.2025 - a participat la a șasea sesiunea informativă privind produsul financiar „FACEM Sustainable Investments BGK” în cadrul Incubatorului de Afaceri al orașului Ceadâr-Lunga.
- Participare la sesiuni preliminare pentru a discuta conținutul cu IRMIR Programului de consolidare a capacităților pentru instituțiile de dezvoltare regională și locală. Examinarea draftului Programului de consolidare a capacităților autorităților publice locale în managementul proiectelor, elaborat de IRMIR.
- Ca membru al grupului GL-22 participat la set de treninguri în cadrul proiectului «Suport pentru administrația publică din Moldova în procesul de aderare în UE domeniul gestionării fondurilor europene».
- Reprezentanții a ADR UTA Găgăuzia au participat în ciclul de instruire destinate consolidării capacităților instituțiilor responsabile de implementare a politicii de dezvoltare regională și locală. Proiectul este desfășurat în cadrul programului „Implementarea programului de consolidare a capacităților instituțiilor publice responsabile de politica de dezvoltare regională și locală în contextul statutului de țară candidată la UE al Republicii Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul proiectului EU4MR, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Institutul de Dezvoltare Urbană și Regională din Polonia. Ciclul de instruire a inclus 5 module. Ciclul de formare a inclus 5 module cu durata de 1-2 zile fiecare.
- 28–29.10.2025 - instruirii în domeniul revitalizării urbane, reprezentanții din cadrul ADRG și APL;
- 10.11.2025 - ședința online referitor la actualizarea Liniilor de revitalizare urbană/Raportul analitic, elaborat de partenerii IRMIR, privind modul în care Orientările privind revitalizarea urbană în Republica Moldova;
- 11.12.2025 - participarea la trainingul referitor la RU și rezumatul la Liniile directoare pentru Revitalizarea Urbană organizată de către SF PL





Imagina 35-37. Cooperarea cu "Solidarity Fund" (Polonia)

Cooperarea cu proiectului Enricher

21–24 ianuarie, în cadrul proiectului Enricher „Elaborarea conceptului de turism verde prin instruire”, am participat în calitate de expert la cea de-a treia serie de traininguri axate pe dezvoltarea turismului durabil în Georgia și Republica Moldova.

Cooperarea cu proiectul "PNUD":

21.02.2025 Ședință de lucru la ADR UTA Găgăuzia cu reprezentanții proiectului Elvețian și ai PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”/ PRIM (Piețe reziliente și incluzive în Moldova/United Nations Development Programme), unul dintre obiectivele căruia este crearea și dezvoltarea microclustere locale cu specializare economică inteligentă și de nișă.

Cooperarea cu Centrul de Dezvoltare Internațională al Estoniei (ESTDEV) în parteneriat cu Civitta (Moldova) în realizarea proiectului “IMPACT Găgăuzia”

La data de 09.09.2025 a fost semnat Memorandumul de parteneriat între ESTDEV și Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia. La aceeași dată a avut loc lansarea proiectului IMPACT UTA Găgăuzia, implementat de Centrul de Dezvoltare Internațională al Estoniei (ESTDEV) în parteneriat cu Civitta și Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia. Inițiativa are drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale, mediului de afaceri, societății civile și mediului academic din Găgăuzia pentru pregătirea și implementarea proiectelor conform standardelor Uniunii Europene. În cadrul lansării programului IMPACT Găgăuzia, a fost realizat un exercițiu practic în grupuri, în cadrul căruia au fost prezentate elementele de bază pentru pregătirea cererilor conceptuale de proiect.

În cadrul proiectului IMPACT GAGAUZIA au fost organizate o serie de evenimente de instruire:

Instruiri online:

- 20.10.2025– Instrucțiuni online: Introducere în managementul de proiect

Planificare strategică în proiecte, Fundamentele managementului de proiect

Prezentarea generală a procesului de strângere de fonduri, 46 de participanți

- 21.10.2025– Instrucțiuni online: Fundamentele asigurării calității în proiecte;

Prezentarea generală a implementării și controlului proiectelor; Management financiar în proiecte;

Pregătirea bugetului: Cazul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală;

Principii de bază ale managementului financiar, 33 de participanți

22 .10.2025– Instrucțiuni online: Fundamentele monitorizării și evaluării proiectelor; Analiza riscurilor.

Fundamentele procesului de audit, 34 de participanți, 3 întâlniri de mentorat:

29.10.2025 – Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul turismului, 12 participanți;

29.10.2025 – Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul mobilității și dezvoltării urbane, 7 participanți;

29.10.2025 – Elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul tehnologiilor digitale și SMART, 8 participanți.

24.12.2025 - IMPACT Gagauzia: prezentarea finală a ideilor de proiect. Consolidarea potențialului proiectelor de cooperare ale Uniunii Europene în vederea sprijinirii dezvoltării autorităților locale.



Imaginea 38-40. «Cooperarea cu Centrul de Dezvoltare Internațională al Estoniei (ESTDEV) în parteneriat cu Civitta (Moldova) în realizarea proiectului “IMPACT Găgăuzia»

Provocări și riscuri

Provocări pe parcursul perioadei de raportare:

În procesul de activitate o provocare semnificativă ține de lipsa datelor socio-economice pentru regiune necesare pentru o evaluare obiectivă și actualizarea cu întârziere a bazei de date care conține principalii indicatori statistici în domeniul dezvoltării regionale face dificilă o analiză veridică a situației

actuale din regiune. Acest lucru s-a manifestat în procesul de elaborare a POR-ului 2022-2024 precum și în procesul de elaborare a rapoartelor.

Riscuri manifestate pe parcursul perioadei de raportare:

Pe parcursul perioadei de raportare, în procesul de implementare a POR-ului UTA Găgăuzia s-au manifestat un șir de riscuri economice și operaționale care au avut influență asupra atingerii obiectivelor planificate.

Riscuri manageriale/operaționale

În perioada de raportare, unii beneficiari ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanțare nu au aprobat deciziile privind alocarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor. Acest lucru creează incertitudine cu privire la continuarea anumitor proiecte.

Riscuri economice:

Creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Creșterea prețurilor la materialele de construcție este într-o dinamică constantă, ceea ce creează riscul nefinalizării proiectelor demarate în cazul în care antreprenorii întâmpină dificultăți în achiziționarea materialelor de construcție necesare.

Lipsa operatorilor economici interesați de a participa la procedurile de achiziții lansate.

Urmare a instabilității economice, tot mai puțini operatori economici sunt cointeresați de a participa la licitațiile lansate de ADR UTA Găgăuzia.

Lipsa competențelor în atragerea și gestionarea resurselor din partea partenerilor externi.

Pentru realizarea obiectivelor POR 2022-2024 mijloacele din FNDRL nu sunt suficiente. Este necesară mobilizarea inclusiv a mijloacelor din partea partenerilor de dezvoltare. În acest sens lipsesc la nivel de regiune competențe suficiente de atragere și gestionare a resurselor externe. În acest sens sunt necesare eforturi pentru implicarea APL în activități de instruire privind identificarea surselor alternative de finanțare.

Riscuri operaționale:

Lipsa utilizării coordonate a fondurilor naționale în vederea dezvoltării regionale.

În vederea asigurării posibilității de participare a ADR în cadrul programelor și proiectelor transfrontaliere este necesar de a prevedea posibilitatea asigurării contribuțiilor solicitate din contul mijloacelor FNDRL

De asemenea sunt necesare mecanisme care ar permite cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională din diferite surse naționale.

Bune practici și lecții învățate

Printre cele mai relevante lecții învățate pe parcursul perioadei de raportare pot fi menționate următoarele:

- Este necesar de a intensifica conlucrarea cu autoritățile publice locale în vederea diseminării informațiilor cu privire la programele de finanțare și fondurile disponibile pentru implementarea unor proiecte prioritare. Doar plasarea informațiilor pe pagina web a ADR nu este suficientă. Comunicarea ”pe viu” cu APL, cu implicarea experților și reprezentanții partenerilor de dezvoltare este o modalitate eficientă pentru a stimula activismul APL.
- În conlucrarea cu partenerii de dezvoltare este necesar de a stabili un cadru foarte clar al colaborării și de a stabili responsabilitățile părților implicate în procesul de colaborare.

- În procesul de analiză a progreselor realizate în implementarea strategiei de dezvoltare regională, se constată lipsa unui mecanism de colectare a datelor relevante privind activitățile și acțiunile întreprinse de alți actori de dezvoltare regională decât ADR.

Concluzii

- ADR UTA Găgăuzia a continuat în perioada de raportare procesul de implementare a proiectelor incluse în POR 2022-2024. Din cele 10 proiecte POR incluse în documentul de program unificat, 5 proiecte erau în curs de implementare în 2025, dintre care 2 a fost finalizat;
- ADR ca instituție cu rol de coordonare a acestui proces la nivel local, a acordat suportul necesar Unității de implementare a proiectelor. De asemenea în comun cu UIP au continuat activitățile pentru dezvoltarea propunerilor de proiecte prioritare incluse în PNDOPC 2021-2027;
- În perioada de raportare, ADR a organizat la nivel regional consultarea APL-urilor de nivelul I privind condițiile de participare în cadrul apelului de propuneri de proiecte în cadrul concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
- Cooperarea cu partenerii de dezvoltare a adus rezultate semnificative pentru ADR UTA Găgăuzia. Astfel în perioada de raportare, a continuat colaborarea în cadrul proiectului GIZ/SBC este focalizată pe 2 componente: Dezvoltarea urbană integrată și Dezvoltarea economică locală. Cooperarea a continuat cu cu Solidarity Fund PL și cu proiectul Băncii Mondiale „Siguranța alimentării cu apă și canalizare în Moldova”.
- Dezvoltarea profesională continuă a angajaților ADR UTA Găgăuzia și actorilor regionali prin participarea la diverse programe de instruire și cursuri de dezvoltare profesională pe domeniile prioritare dezvoltării regionale, dar și atragerii fondurilor și investițiilor europene pot contribui semnificativ la accelerarea procesului de dezvoltare regională.
- Este necesară promovarea proiectelor regionale de importanță majoră printre partenerii de dezvoltare în vederea inițierii unor acțiuni comune care ar duce la implementarea acestor proiecte.

Director ADR UTA Găgăuzia



Tatiana DONCEVA


ELABORAT:

Svetlana GRADINAR, șef secție planificare și cooperare regională
 Valerii MITIOGLO, șef secție management integrat al proiectelor
 Ecaterina ARNAUT, șef secție administrativă
 Alexandr GHEORGHIȚA, șef secție monitorizare și evaluare



COORDONAT:

Veronica EȘANU, Șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală



Nr./or.	Codul proiectului	Denumirea proiectului	Sursa și mărimea mijloacelor financiare aprobate pe durata implementării proiectului							Mijloace financiare contractate		Cheltuieli efectuate											Sold la sfârșitul perioadei de raportare din mărimea finanțării aprobate pentru anul de gestiune	Evaluarea proiectului după culoare (verde, galben, rosu)	
			total	FNDRL		APL/ONG		GIZ		Alții (de specificat)	total	inclusiv în anul de gestiune	Total pe durata de derulare a proiectului	total pentru anul de gestiune	FNDRL	APL/ONG	GIZ	Alții (de specificat)	inclusiv perioada raportată						
				total	inclusiv pentru anul de gestiune	total	inclusiv pentru anul de gestiune	total	inclusiv pentru anul de gestiune										total	FNDRL	APL	GIZ			Alții (de specificat)
1	2	3	4=5+7+8+10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18	19=20+21+22+23	20	21	22	23	24=6-15(FNDRL) 24=9-17 (GIZ)	24	
PROGRAM 1: COMPETITIVITATE																									
1	G113005C	Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”	17 199 364,0	15 270 374,0	3 023 969,8	1 928 989,98	964 495,0	0,00	0,00	0,00	16 390 787,1	2 402 739,4	16 390 787,1	3 148 733,4	2 402 739,4	745 994,0	0,0	0,0	3 147 948,4	2 401 954,4	745 994,0	0,0	0,0	621 230,4	Verde
2	G112010C	Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postrincubare a rezidenșilor Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei run Ceadir-lunga și a regiunii	36 500 000,0	22 500 000,0	21 528 507,0	14 000 000,0	7 000 000,0	0,0	0,0	0,0	34 812 086,8	20 955 329,1	25 201 493,5	20 955 329,1	20 955 329,1	4 246 164,4	0,0	0,0	20 955 329,1	20 955 329,1	4 246 164,4	0,0	0,0	573 177,9	Verde
PROGRAM 2: DEZVOLTARE URBANĂ																									
3	G22009C	Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la călărirea Casei de Cultură din orașul Vulcănești UTA Găgăuzia	15 961 031,8	14 364 928,6	11 230 944,9	1 424 582,9	1 424 582,9	0,00	0,00	0,00	14 245 828,6	9 987 301,1	12 366 652,5	10 776 351,8	9 977 301,1	799 050,6	0,0	0,0	10 777 351,8	9 978 301,1	799 050,6	0,0	0,0	1 253 643,8	Galben
4	G223011C	Spațiu de interacțiune: amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul Tukaneasca, mun. Comrat	15 796 741,0	14 217 066,9	3 826 024,9	1 106 719,0	1 106 719,0	0,00	0,00	0,00	11 067 189,7	11 067 189,7	11 067 189,7	11 067 189,7	9 960 470,8	1 106 719,0	0,0	0,0	4 799 527,2	3 692 808,2	1 106 719,0	0,0	0,0	6 134 445,9	Verde
Total prioritatea 1			85 457 136,80	66 352 369,54	39 609 446,69	18 460 291,81	10 495 796,82	0,00	0,00	0,00	76 515 892,26	44 412 559,41	65 026 122,86	45 947 604,02	43 295 840,44	4 992 158,33	0,00	0,00	39 680 156,41	37 028 392,83	4 992 158,33	0,00	0,00	3 686 393,8	
PROGRAM 3: INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ																									
5	G331017L	Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpuije din mun. Comrat.	6 211 684,0	5 590 515,6	2 221 714,9	469 527,3		0,00	0,00	0,00	4 695 272,8	4 695 362,8	3 855 289,8	840 073,1	840 073,1	0,0	0,0	0,0	2 230 804,9	2 230 804,9	0,0	0,0	0,0	1 381 641,8	Verde
Total prioritatea 3			6 211 684,00	5 590 515,60	2 221 714,88	469 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 272,84	4 695 362,84	3 855 289,79	840 073,05	840 073,05	0,00	0,00	0,00	2 230 804,88	2 230 804,88	0,00	0,00	0,00	1 381 641,83	
Total ADR			91 668 820,8	71 942 885,1	41 831 161,6	18 929 819,1	10 495 796,8	0,0	0,0	0,0	81 211 165,1	49 107 922,3	68 881 412,7	46 787 677,1	44 135 913,5	4 992 158,3	0,0	0,0	41 910 961,3	39 259 197,7	4 992 158,3	0,0	0,0	2 304 751,9	

Anexa 3. Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor ADR pe perioada a anului 2025

Nr	Forma de instruire	Data	Unitatea de măsură		Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia									Nr. participanti		Total
				Donceva T.	Arnaut E.	Mitioglo V.	Sibov A.	Sarî I.	Gradinar S.	Cîssa E.	Gheorghîța A.	Cîssa M.	Sarî L.	CRD	APL	
	Sesiuni de instruire organizate															
1.	Sesiune de informare privind completarea cererilor de finanțare în cadrul Concursului pentru selectarea proiectelor de dezvoltare regională în anul 2024.	14.03.2025												-	5	8
2.	Dezvoltarea potențialului de cooperare cu Uniunea Europeană: proiecte de sprijinire a dezvoltării autorităților locale, programul de asistență tehnică „Impact UTA Gagauzia”	09.09.2025												3	30	98
3.	Sesiunea informativă cu privire Apelului III de propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunărea 2021-2027	16.10.2025												-	19	21

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
4.	Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: 1. Introducere în managementul proiectelor 2. Planificarea strategică în proiecte 3. Bazele managementului proiectelor Gradinar S.	20.10.2025												1	19	45
5.	Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: 1. Bazele asigurării calității în proiecte; 2. Prezentare generală a implementării și controlului proiectului; 3. Gestionarea finanțelor în proiecte; Mitioglo V.	21.10.2025												-	17	34

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîta A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
6.	Seminar de instruire în cadrul proiectului «IMPACT UTA Găgăuzia», pe teme: 1. Bazele monitorizării și evaluării proiectelor; 2. Analiza riscurilor potențiale; 3. Bazele procesului de audit. Cîssa M.	22.10.2025												-	15	33
7.	IMPACT Gagauzia: prezentarea finală a ideilor de proiect. Consolidarea potențialului proiectelor de cooperare ale Uniunii Europene în vederea sprijinirii dezvoltării autorităților locale	24.12.2025												1	9	36
Participări la alte instruiri																
8.	Training «Experiential learning methods and tools for competence in green tourism»	21.01.2025 22.01.2025 23.01.2025												-	-	2

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîța A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
9.	Masă rotundă - ”Reziliența macroeconomică a Republicii Moldova în contextul amenințărilor la adresa securității regionale și globale	28.01.2025												-	-	1
10.	Bloc 0: Grupa A. Introducere - înțelegerea fundamentală a abordării UE privind politica regională și dezvoltarea durabilă	06.02.2025												-	-	3
11.	Bloc 0: Grupa B. Introducere - înțelegerea fundamentală a abordării UE privind politica regională și dezvoltarea durabilă	07.02.2025												-	-	3
12.	Online training sessions for the project preparation. «Go for Cooperation Weeks» TESIM	10-14.02.2025												-	-	1
13.	Bloc 1: Programarea și planificarea dezvoltării regionale	10.02.2025												-	-	2

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
14.	Seminar de formare privind arhivarea documentelor	10.02.2025												-	-	1
15.	Block 2: Finanțarea politicii regionale	05.03.2025 06.03.2025												-	-	3
16.	Sesiune de instruire «Go for Cooperation Weeks» TESIM	03- 06.03.2025												-	-	1
17.	Block 3: Monitorizarea și evaluarea în cadrul politicii regionale a UE	10.03.2025 11.03.2025												-	-	2
18.	Sesiune de instruiți, organizată în cadrul proiectului «Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova»	11.03.2025 12.03.2025												-	-	1

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
19.	Training : «Conducere inovatoare»	11.03.2025 12.03.2025												-	-	1
20.	Block 4: Managementul proiectelor	13.03.2025												-	-	3
21.	Vizită de studiu în Polonia	07.04.2025 12.04.2025												-	-	1
22.	Sesiune online cu genericul «Capitala Sportului»	29.04.2025												-	-	1
23.	Sesiune de informare dedicată Apelului pentru Rețele de Transfer URBACT IV	05.05.2025												-	-	2

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîa A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
24.	Sesiune online cu genericul «Capitala Sportului»	07.05.2025												-	-	1
25.	Training session on EU Cohesion Policy and Chapter 22 for the authorities of the Republic of Moldova	14.05.2025												-	-	2
26.	Webinar- Coordonarea eficientă a achizițiilor TIC în instituțiile publice	21.05.2025												-	-	1
27.	Sesiune de informare dedicate celui de-al doilea apel de proiecte cu valoare mică, lansat în cadrul programului Interreg-Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027	27.05.2025 03.06.2025												-	-	2
28.	Sesiune de informare FACEM Investiții Sustenabile BGK, produs de finanțare nou lansat.	05.06.2025												-	-	3

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîța A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
29.	Vizită de studiu în Republica Cehia	08-14.06.2025												-	-	1
30.	Sesiune de informare «Calitatea vieții într-o Moldova verde»	17.06.2025												-	-	1
31.	Sesiune de consultare privind implementarea sistemului de achiziții publice centralizate	25.06.2025												-	-	1
32.	Business seminar Team Poland for the EU Moldova Growth Plan.	26.06.2025												-	-	1
33.	Sesiunea de instruire „1st Advisory Mission in Chișinău”	26.06.2025 27.06.2025												-	-	2

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
34.	Initial training on programme cycle management under Cohesion Policy. GL-22	01.07.2025 02.07.2025												-	-	1
35.	Dialog strategic privind implementarea Programului Național de Specializare Inteligentă- «Smart Moldova».	17.07.2025												-	-	1
36.	Instruiri pentru Autoritățile Publice Locale (APL) în dezvoltare și managementul integrat al proiectelor. Traininguri pentru formatori	23- 29.07.2025												-	-	4
37.	Traininguri pentru formatori. Mentoring session.	26.08.2025 29.08.2025 03.09.2025 04.09.2025 05.09.2025 10.09.2025												-	-	3

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîța A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
38.	Sesiunea de instruire: «Specializare inelegantă. Strategii pentru dezvoltarea economică locala și regională»	18.09.2025 19.09.2025												-	-	1
39.	2nd Advisory mission in Chișinău	22- 24.09.2025												-	-	2
40.	Sesiunea informativă cu privire Apelului III de propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunărea 2021-2027	08.10.2025 15.10.2025												-	-	1
41.	Cursul de instruire «Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI»	22.10.2025- 24.10.2025												-	-	1
42.	Sesiune de formare dedicată diagnosticării și identificării zonelor degradate, precum și participării publice la procesul de revitalizare	28.10.2025												-	3	4

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
43.	Sesiune de formare dedicată diagnosticării și identificării zonelor degradate, precum și participării publice la procesul de revitalizare	29.10.2025												-	5	4
44.	Coordinating and communicating on EU cohesion funds: experience sharing workshop. GL-22	06.11.2025												-	-	2
45.	Interreg Programmes 2021-2027 with Poland participation. Control and audit. Financial management.	17.11.2025												-	-	3
46.	Dialog între actorii din sectorul de alimentare cu apă și canalizare. Concluzii și lecții învățate.	18.11.2025												-	-	1
47.	Instruire cu tematica : «Aplicarea legislației privind accesul la informațiile de interes public»	28.11.2025												-	-	2

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghîta A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
48.	Training for OMPU on the Urban Revitalization Program	03.12.2025 04.12.2025												-	-	2
49.	A 3-a Misiune de Consiliere ;i a 3-a Sesiune de formare la Chişinău. Sesiunea spre înţelegerea revitalizării urbane	11.12.2025 12.12.2025												-	3	4
50.	Cursul de instruire în domeniul raporturilor de muncă	18.12.2025												-	-	1
Conferinţe, forumuri																
51.	Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională dedicată aniversării 34-a înfiinţării Universităţii de Stat din Comrat.	11.02.2025												-	-	1
52.	Conferinţă online dedicată relaţiilor de muncă în întreprinderi şi instituţii	02.06.2025												-	-	1

<i>Nr</i>	<i>Forma de instruire</i>	<i>Data</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Nume, prenume al colaboratorului ADR Găgăuzia</i>										<i>Nr. participanti</i>		<i>Total</i>
				<i>Donceva T.</i>	<i>Arnaut E.</i>	<i>Mitioglo V.</i>	<i>Sibov A.</i>	<i>Sarî I.</i>	<i>Gradinar S.</i>	<i>Cîssa E.</i>	<i>Gheorghița A.</i>	<i>Cîssa M.</i>	<i>Sarî L.</i>	<i>CRD</i>	<i>APL</i>	
53.	Conferință de deschidere : «Bune practici și transfer de cunoștințe pentru consolidare capacității administrative în politica de dezvoltare regională între România și RM»	11.09.2025												-	-	2
54.	Forumul privind dezvoltarea urbană durabilă «Dezvoltarea urbană: provocări, soluții, viitor»	07.11.2025												4	23	60
55.	Forumul regional din Comrat „Parteneriate locale pentru integrarea europeană”	19.11.2025												2	-	4
56.	Conferința «Orașe Inteligente-Viitorul Urban al Regiunilor»	27.11.2025												-	-	1
57.	Conferința națională științifico-practică „Probleme și provocări ale economiei regionale în contextul globalizării”	11.12.2025												-	-	1
	TOTAL			19	2	13	8	-	30	13	5	12	3	11	148	425
